

夢洲関連工事の契約状況(令和4年2月時点)

Confidential
事業調整会議関係者限り

【夢洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
自治体 管路	大阪港湾局 (関西電力送配電(株))	16-1	夢洲自治体管路新設工事	R3.3.17	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	(株)かんでんエンジニアリング 大阪北支店
	大阪港湾局 (エヌ・ティ・ティ・インフ ラネット(株))	16-2	夢洲自治体管路新設工事	R3.4.23	R6.3.15	夢洲まちづくり事業により必要となる自治体管路工 事	(株)協和エクシオ

【舞洲地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市 水道局	12-7	北港白津1丁目外600mmその他配水管布 設工事他	R3.3.16	R4.9.30	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 の新設工事【舞洲1・14・16号線】	明雄建設(株)
		12-8	北港白津1丁目600mm配水管布設工事他	R3.3.16	R4.9.30	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 の新設工事【舞洲16・18号線】	東住吉建設(株)

【その他地区】

区分	発注者	工事情報					受注者
	所属・会社名	番号	工事名称	契約日	工期	工事内容	会社名
上水道 施設	大阪市 水道局	HW1	此花枝管600mm配水管布設工事他	R3.3.9	R5.3.31	大阪・関西万博開催地及びIR開業地等への配水管 の新設工事	(株)ケンセイ

※令和4年2月時点


契約 38件

うち現地着手済み 34件

夢洲関連工事一覧(夢洲地区)(令和4年2月時点)

Confidential
事業調整会議関係者限り

P9

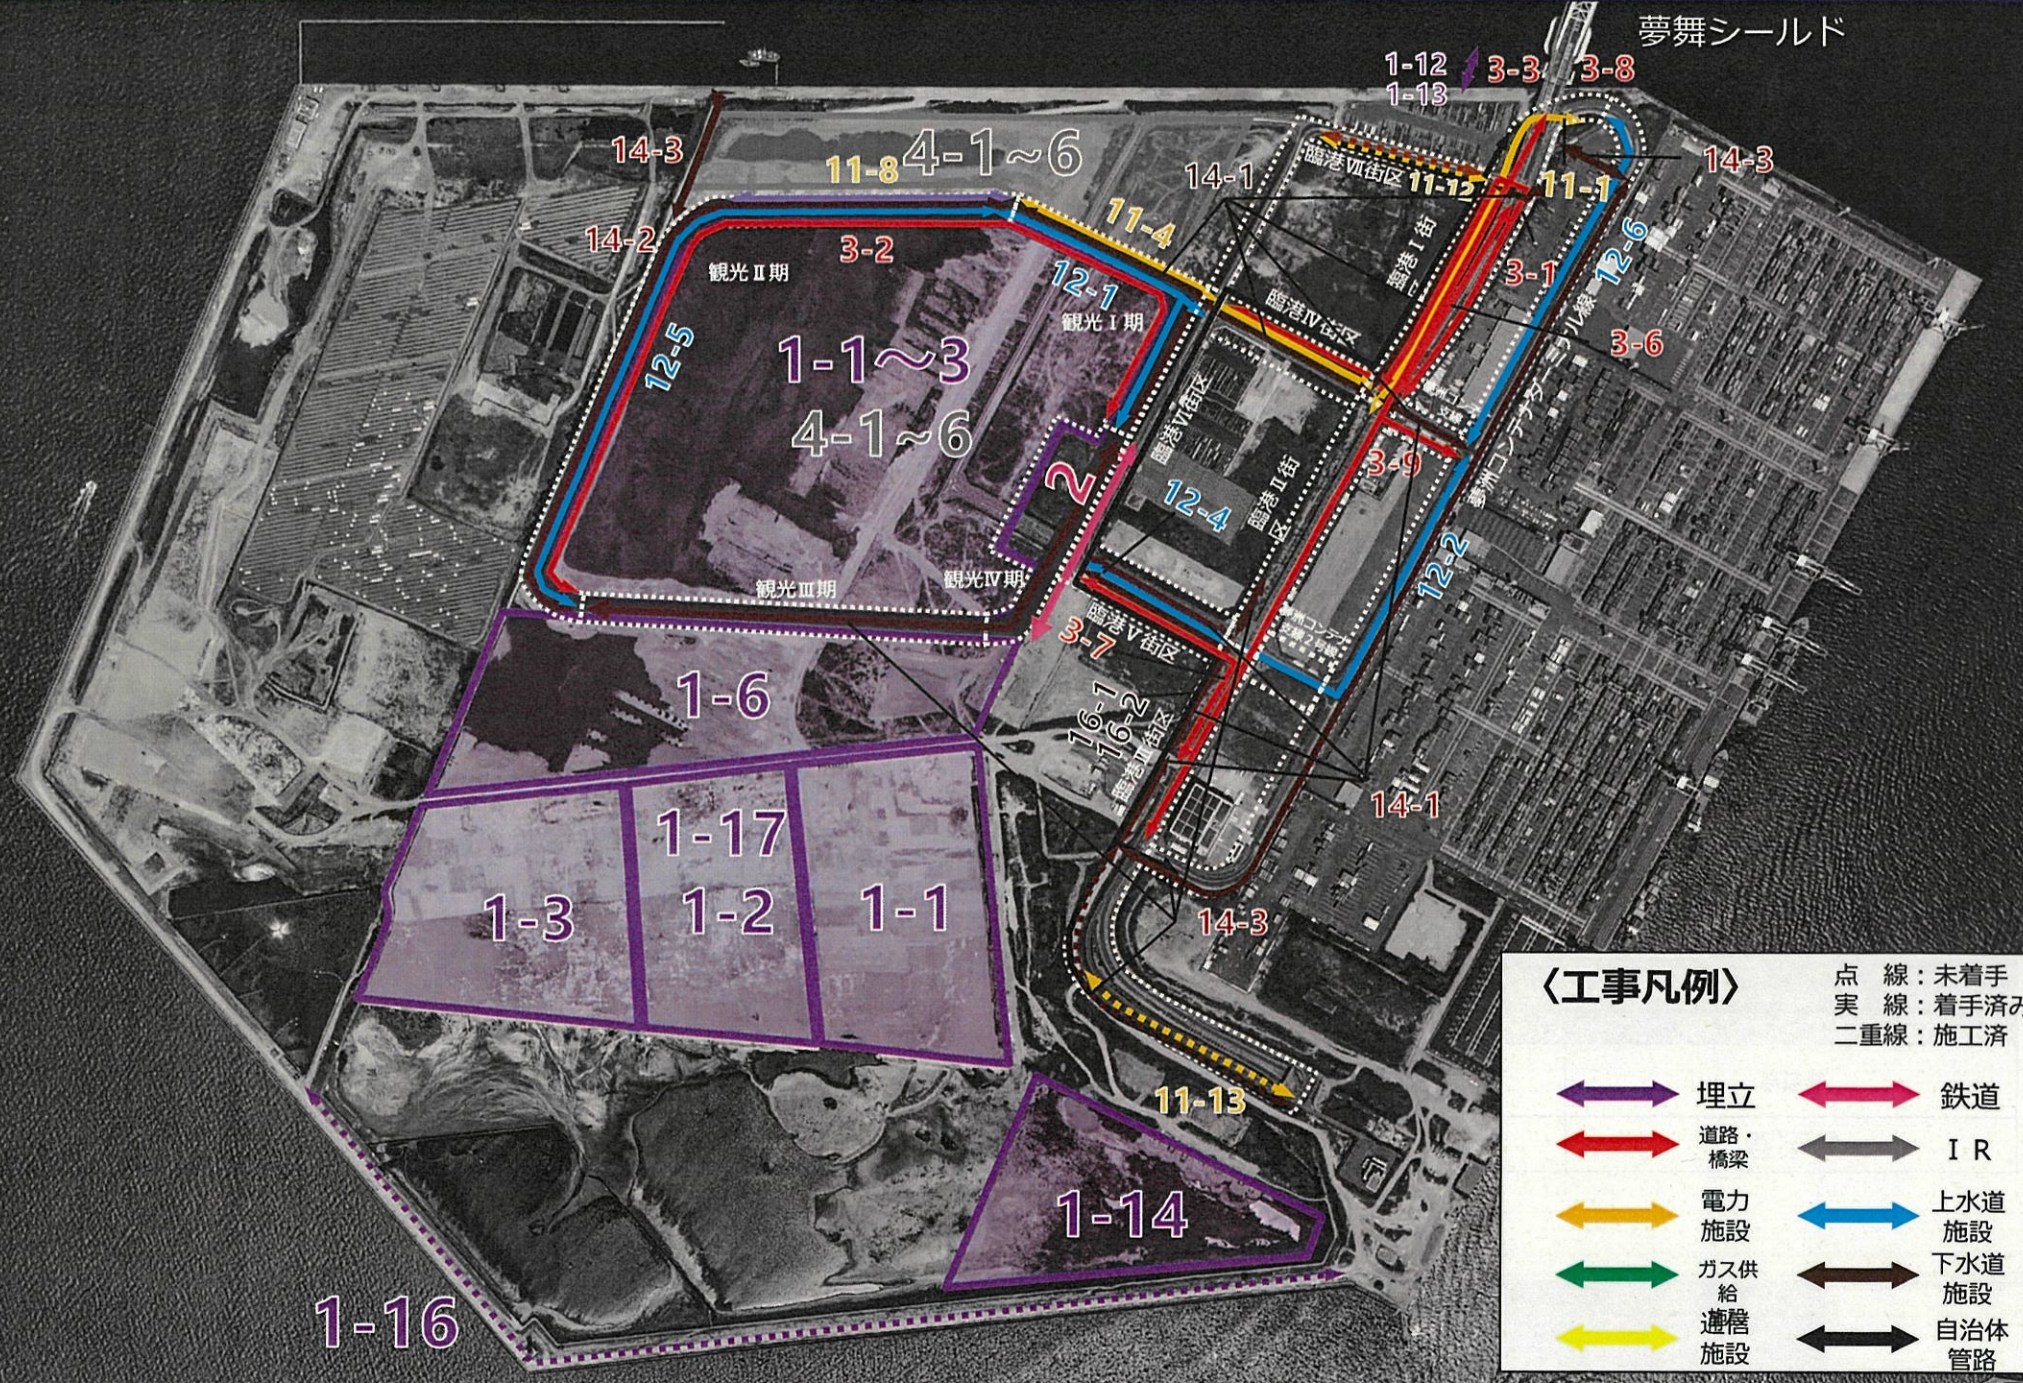


《工事凡例》

点線	: 未着手	実線	: 着手済み	二重線	: 施工済
↔ (Purple)	埋立	↔ (Red)	鉄道	↔ (Grey)	I R
↔ (Red)	道路・橋梁	↔ (Blue)	上水道施設	↔ (Black)	下水道施設
↔ (Yellow)	電力施設	↔ (Black)	自治体管路		
↔ (Green)	ガス供給				
↔ (Light Green)	遊歩施設				

夢洲関連工事一覧(舞洲地区)(令和4年2月時点)

Confidential
事業調整会議関係者限り

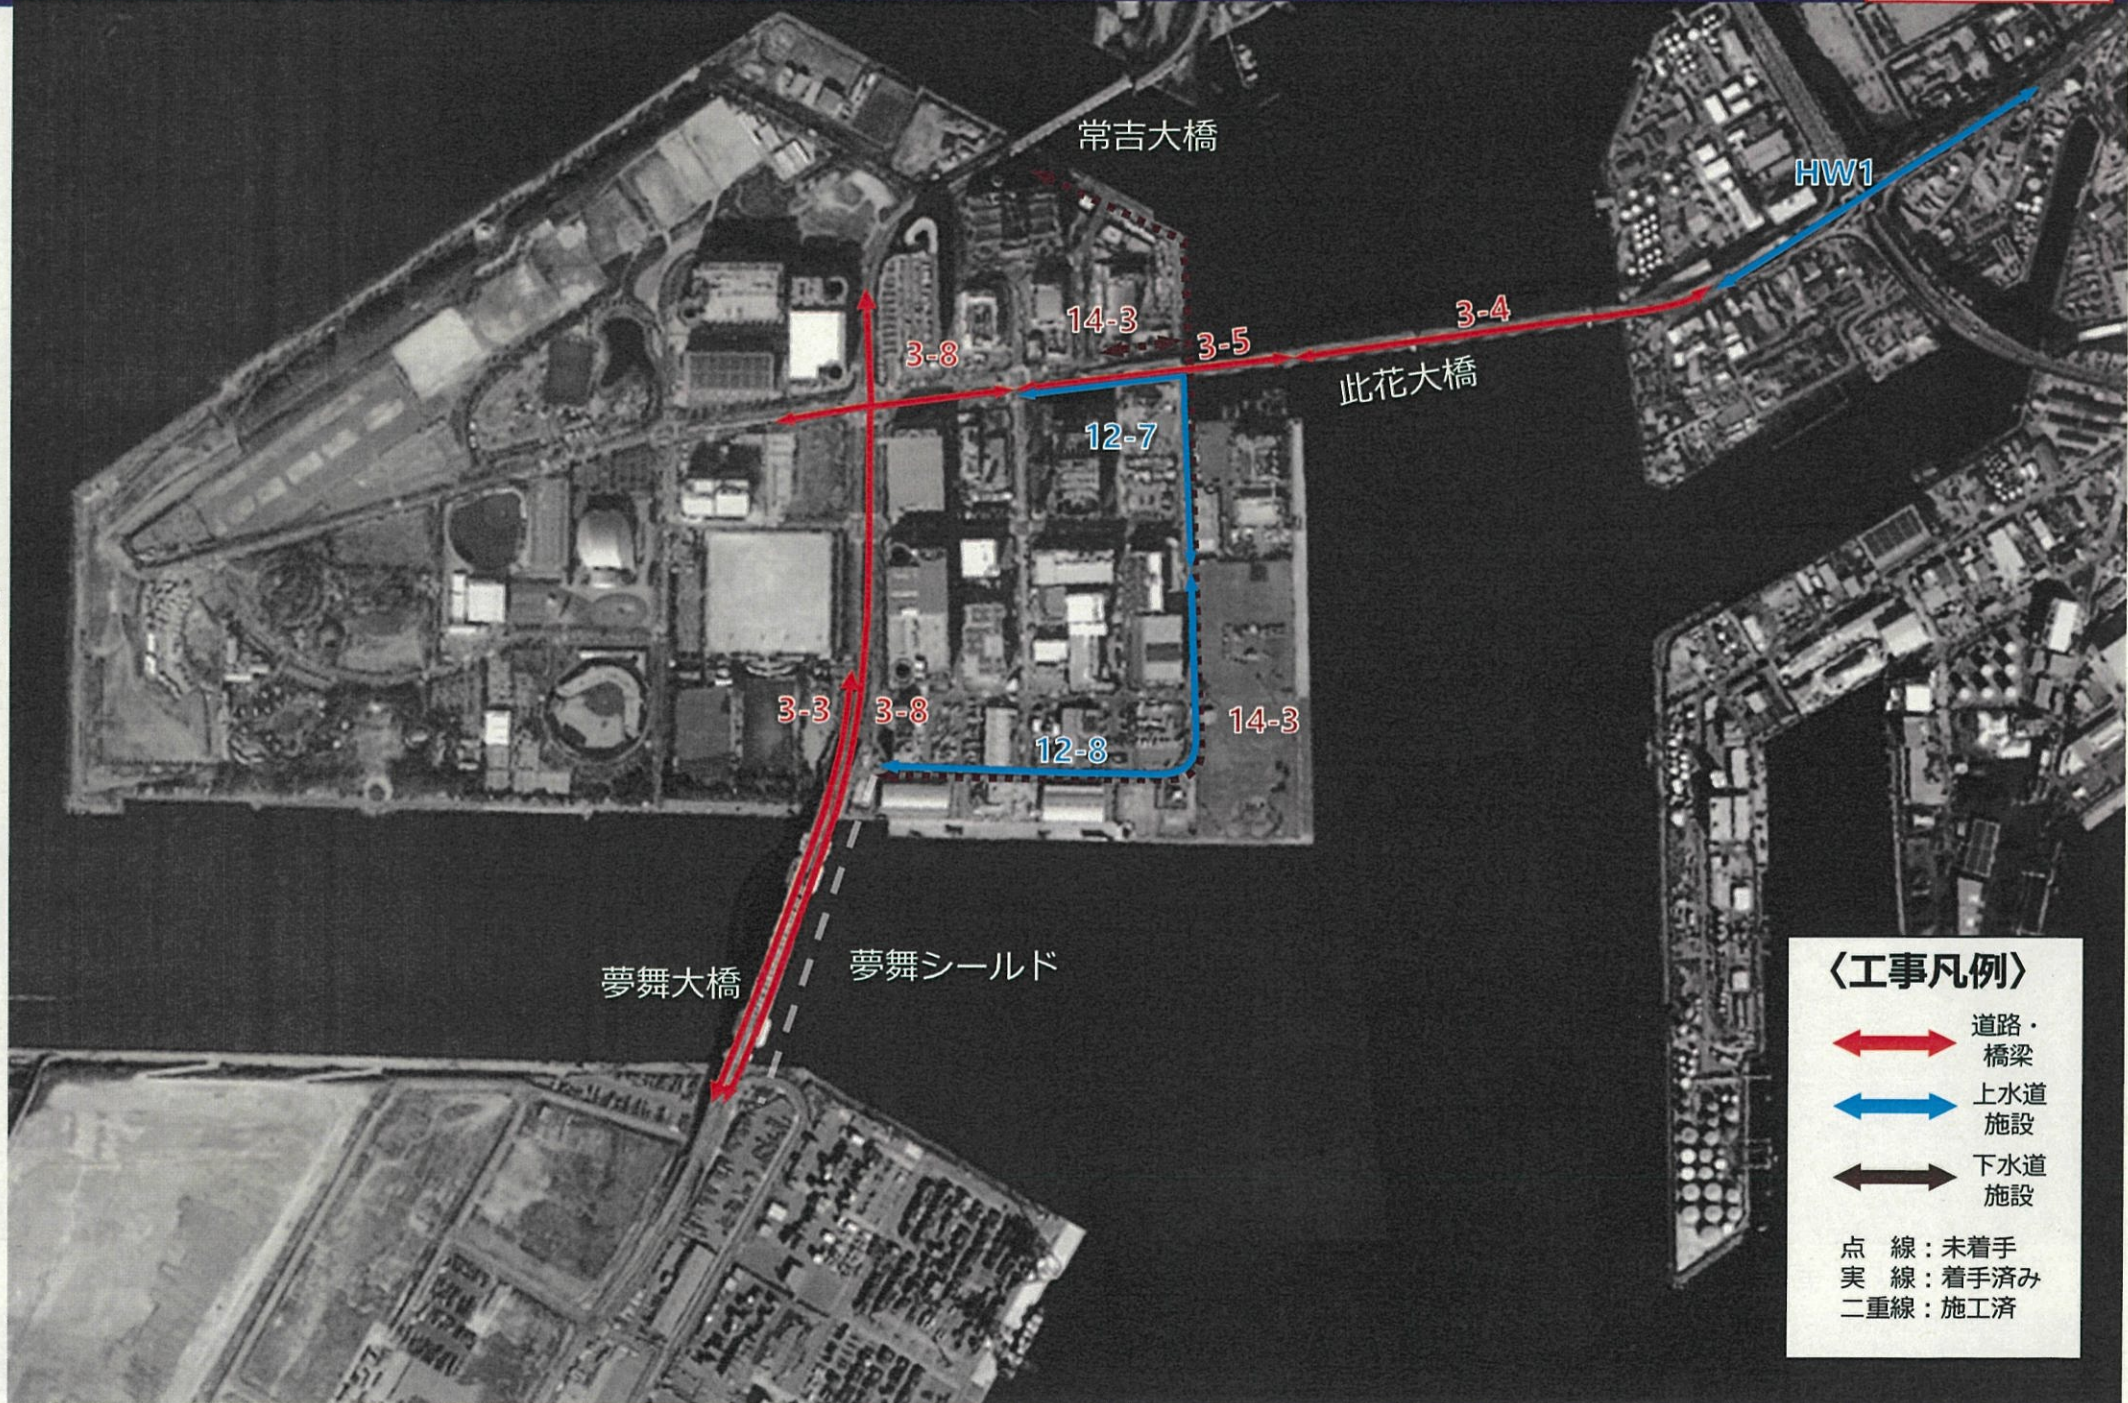

夢洲関連事業の現場状況について

※()内は工事番号

【7】下水管敷設工事の状況




【5】観光外周道路新設工事の状況



【15】夢舞大橋(3車線化)の状況



【10】鉄道駅舎建設工事の状況

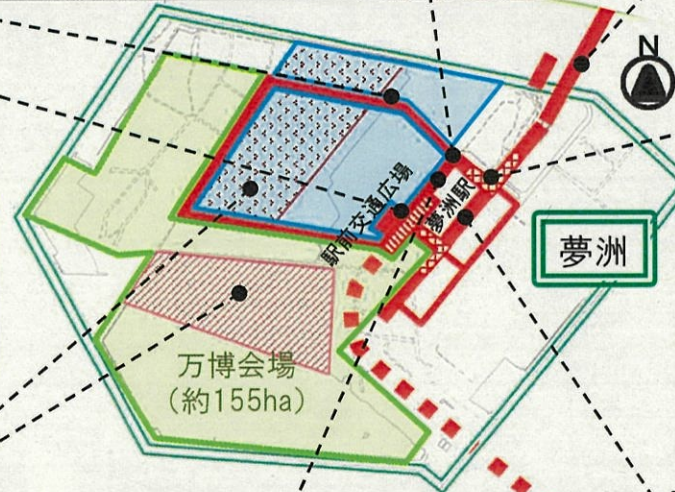

【6】夢洲北高架橋迂回路設置の状況



【1】【2】埋立・盛土工事の状況



【8】上水管敷設工事の状況



【9】電気管路敷設工事の状況

