

コスモ石油株式会社堺製油所高度化事業に係る
事後調査報告書

平成27年7月分
コスモ石油株式会社

1. 事業者の氏名及び住所

事業者の名称 : コスモ石油株式会社
代表者の氏名 : 代表取締役社長 森川 桂造
主たる事務所の所在地 : 東京都港区芝浦一丁目1番1号

2. 対象事業の名称

コスモ石油株式会社堺製油所高度化事業

3. 対象事業の実施状況

3-1. 調査実施日

平成27年7月1日～平成27年7月31日

3-2. 調査時の運転の状況

7月度は、所内で必要な蒸気量が低減することに伴い7月6日から31日まで、2号中圧ボイラーを停止した。

また、6月29日から7月4日までの間で原油蒸留装置の点検補修のため、同装置と軽油水添脱硫装置を停止し、6月30日から7月5日までの間で第2軽油水添脱硫装置を停止した。また、7月30日以降は流動接触分解装置の点検補修のため、同装置とFCCガソリン脱硫装置を停止した。

運転の内容	平成27年7月		
	上旬	中旬	下旬
通常運転			
2号中圧ボイラーの停止 (非定常運転)			
原油蒸留装置、 軽油水添脱硫装置の停止 (非定常運転)			
第2軽油水添脱硫装置の停止 (非定常運転)			
流動接触分解装置と FCCガソリン脱硫装置の停止 (非定常運転)			

4. 事後調査の方法

4-1. 調査内容

事後調査の調査項目、調査地点、調査期間及び頻度、並びに調査方法は、表-1 に示すとおりである。

表-1 施設の供用における事後調査の方法

調査項目		調査地点	調査期間及び頻度	調査方法
大気質	窒素酸化物 排出濃度・量	各煙突 図-1,3 参照	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 毎日	連続測定装置等を用いる方法
	低NOxバーナ性能 排煙脱硝設備性能	排煙脱硝設備 出入口	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 年1回	窒素酸化物濃度、残存酸素濃度等より算出 (JIS-K-0104)
	二酸化硫黄 排出濃度・量	各煙突 図-1,3 参照	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 毎日	連続測定装置等を用いる方法
	ベンゼン回収 設備性能	ベンゼン 回収設備 出入口	高度化施設運転開始後5年 年2回	ガスクロマトグラフ法
水質	水素イオン濃度 化学的酸素要求量 燐含有量 窒素含有量	新設排水処理施設 出口 図-2,3 参照	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 毎日	連続測定装置を用いる方法
		No.1排水口 及び No.3排水口 図-2,3 参照	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 No.1排水口:1回/週 (ただし、窒素、燐含有量は1回/月) No.3排水口:1回/月	工場排水試験方法による測定 (JIS-K-0102)
悪臭	アンモニア濃度	敷地境界 及び 排水処理施設 周辺 図-3 参照	第1期運転開始後および 高度化施設運転開始後に各1回 (夏季)	環境庁告示第9号別表 第1による測定
廃棄物	発生量 有効利用量 最終処分量 有効利用方法	—	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 年1回	廃棄物の記録台帳を元に 集計
地球環境	エネルギー消費 原単位 二酸化炭素排出量	—	第1期運転開始後5年 高度化施設運転開始後5年 年1回	製油所における燃料使用 量、電力使用量等より 年度データで算出

5. 事後調査の結果及び検証（月次）

5-1. 大気質

合計窒素酸化物排出量と合計二酸化硫黄排出量の平成 27 年度実績（平成 27 年 4 月～7 月）の平均値は別紙 1 に示す通り、非定常運転が継続している。

別紙 1 抜粋

	合計 窒素酸化物排出量 m ³ _N /時	合計 二酸化硫黄排出量 m ³ _N /時
第 1 期工事後計画値	10.766	1.512
年度平均値 (平成 27 年 4 月～7 月 参考値)	6.095	0.684

(1) 各煙突の窒素酸化物排出濃度・量

平成 27 年 7 月度の窒素酸化物の排出状況は、別紙 2 に示す通りである。

3 号煙突の濃度(ppm)と排出量(m³_N/時)で計画値より高い値となっているが、他煙突の系統にある設備からの窒素酸化物排出量が計画値より低いため、製油所全体の合計窒素酸化物排出量は計画値の範囲内である。

・3 号煙突

3 号煙突で窒素酸化物が高くなった原因は、流動接触分解装置（以下「FCC」という。）の触媒再生塔の窒素酸化物がやや高いことによるものである。

FCC の触媒再生塔の窒素酸化物の濃度は、FCC 原料性状の変化、触媒被毒防止剤等の薬品の使用、触媒再生塔の酸素濃度、触媒再生塔の温度分布等の様々な要因の相互関係により、変化する。

現状は、3 号煙突自体で、窒素酸化物を計画値以下にする手段は特定できていないが、今後も、3 号煙突自体での窒素酸化物低減のため、FCC での運転条件等の検討を行い、窒素酸化物を低減させるよう努力する。

(2) 各煙突の二酸化硫黄排出濃度・量

平成 27 年 7 月度の二酸化硫黄の排出状況は、別紙 3 に示す通りである。

6 号煙突の月間最大値の排出量(m³_N/時)で計画値より高い値となっているが、その他の月間最大値と月間平均値は全て計画値の範囲内である。

・6 号煙突

6 号煙突で、二酸化硫黄の排出量(m³_N/時)が 7 月 18 日、19 日に高くなった原因は、6 号煙突の上流にある第 2 軽油水添脱硫装置の燃料使用量及び排出ガス量が、通常と比べ多くなったためである。

上記以外の日には同装置の燃料使用量及び排出ガス量が減少し、二酸化硫黄の排出量(m³_N/時)も計画値の範囲内となっている。

5-2. 水質

水質に係る平成 27 年度実績（平成 27 年 4～7 月）の平均値は別紙 4 から別紙 6 に示す通り、環境影響評価の計画値（定常時）の範囲内である。

別紙 4 上表抜粋

	新設排水処理施設出口 調査地点 12							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		全窒素		全磷	
	m ³ /日	—	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)
計画値	3,960	6.0-8.0	6.0	23.8	5	19.8	0.07	0.3
年度平均値	2,810	7.0	3.5	9.8	2	6.9	0.01	0.0

別紙 5 抜粋

	No. 1 排水口 調査地点 11							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		窒素含有量		磷含有量	
	m ³ /日	—	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)
計画値	21,891	6.0-8.0	6.5	142.3	5	109.5	0.07	1.5
年度平均値	15,125	7.5	5.4	81.3	3	44.8	0.03	0.5

別紙 6 抜粋

	No. 3 排水口 調査地点 10							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		窒素含有量		磷含有量	
	m ³ /日	—	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)	濃度 (mg/L)	汚濁負荷量 (kg/日)
計画値	215	6.0-8.0	6.9	1.5	3	0.6	0.3	0.1
年度平均値	172	7.8	5.1	0.9	2	0.3	0.1	0.0

(1) 新設排水処理施設出口

平成 27 年 7 月度の新設排水処理施設出口の排水の状況は、別紙 4 に示す通りである。全磷について、7 月 7 日、9 日、10 日、25 日、26 日の濃度 (mg/L) と 7 月 25 日、26 日の汚濁負荷量 (kg/日) が計画値より高い値となっているが、月間平均値は全て計画値の範囲内である。

全磷の濃度 (mg/L) と汚濁負荷量 (kg/日) が一時的に高くなった原因は、生物処理設備の下流にある凝集加圧浮上処理設備で生成されるフロックを抜き出す配管が閉塞し、磷を含むフロックが下流に流れたためである。

抜き出し配管を清掃し、閉塞の除去を行う事で計画値の範囲内になっている。

(2) No. 1 排水口出口

平成 27 年 7 月度の No. 1 排水口の排水の状況は、別紙 5 に示す通り、全てが計画値の範囲内である。

(3) No. 3 排水口出口

平成 27 年 7 月度の No. 3 排水口の排水の状況は、別紙 6 に示す通り、全てが計画値の範囲内である。

以上

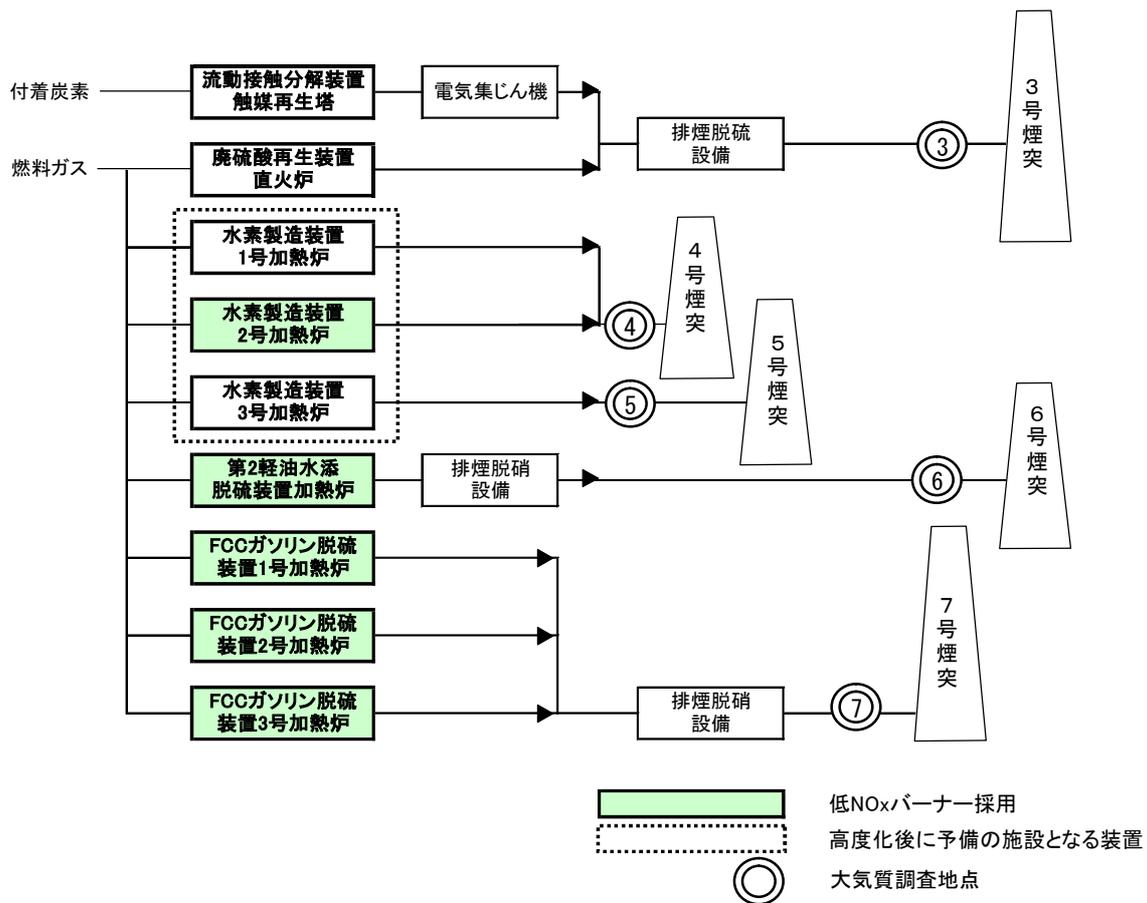


図-1 (2) 供用時における二酸化硫黄、窒素酸化物調査地点 (既設装置)

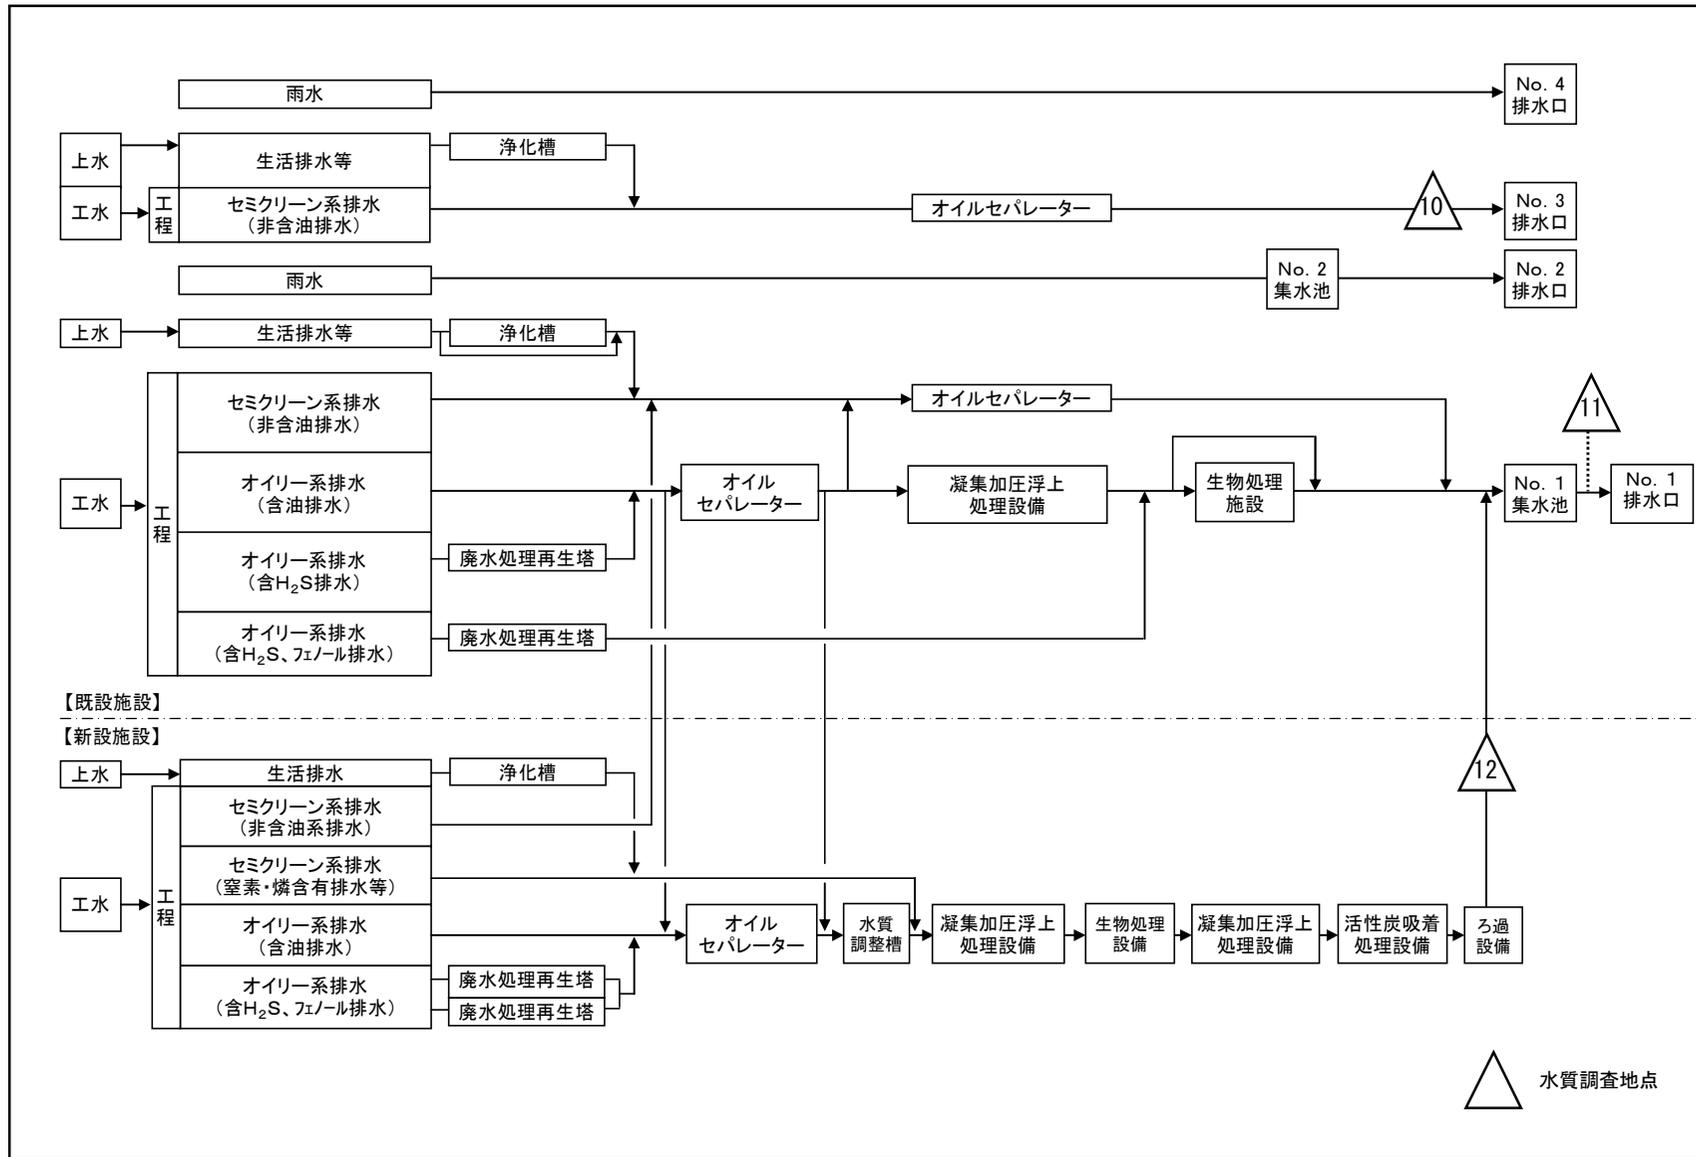


図-2 供用時における水質調査地点

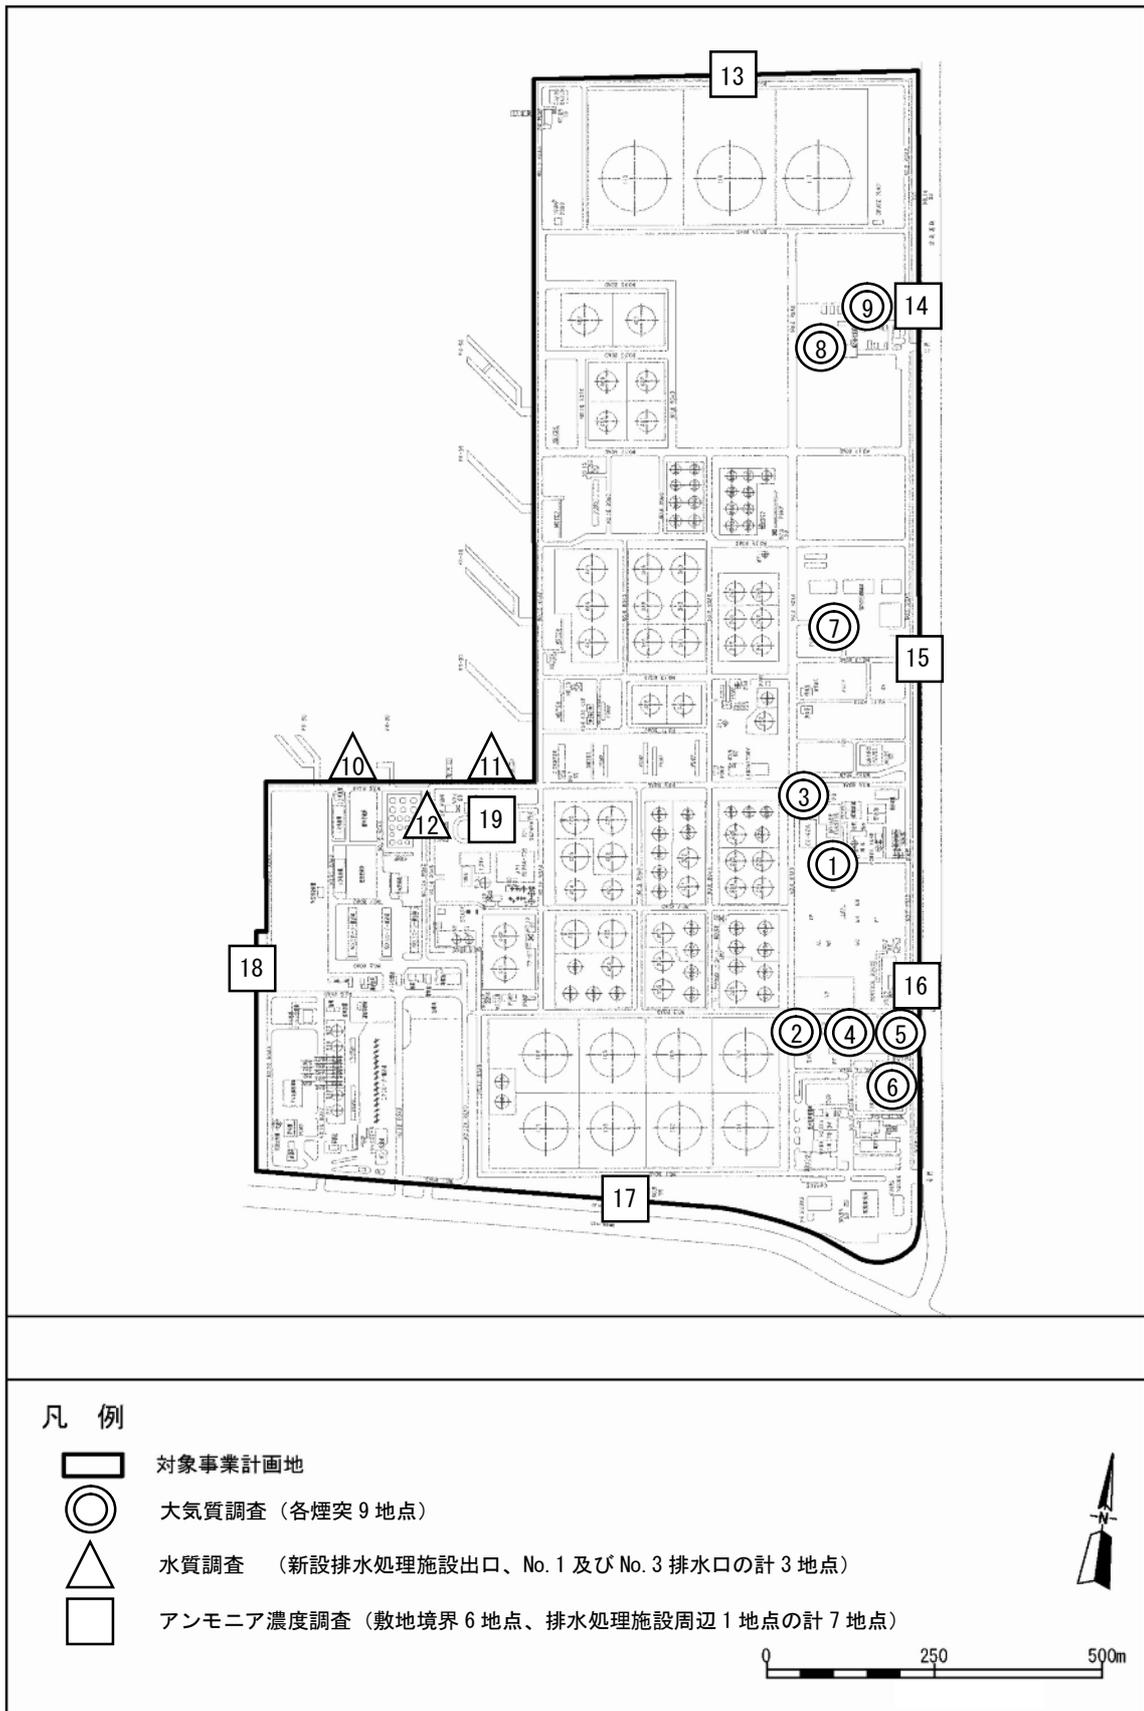


図-3 大気質、水質及びアンモニア濃度調査地点

別紙1 事後調査期間の年度平均値実績(供用時)

窒素酸化物の排出状況に関する事後調査結果(供用時)

時期	各煙突排出値																合計 窒素酸化物排出量 m ³ /時
	1号煙突 調査地点1		2号煙突 調査地点2		3号煙突 調査地点3		4号煙突 調査地点4		5号煙突 調査地点5		6号煙突 調査地点6		7号煙突 調査地点7		8号煙突 調査地点8		
	濃度(ppm)	排出量(m ³ /時)															
第1期工事後計画値	12.7	3.300	25.9	1.337	9.1	0.665	85.0	0.137	83.0	2.303	10.0	0.051	10.0	0.086	11.3	2.888	10.766
年度平均値	11.0	2.540	15.4	0.712	14.9	1.093	78.8	0.071	48.3	0.589	6.4	0.037	7.0	0.066	5.7	0.916	6.095
平成27年4月度平均値	11.9	2.677	15.4	0.697	14.2	1.055	78.0	0.074	40.0	0.492	5.8	0.034	7.0	0.062	5.3	0.902	5.992
平成27年5月度平均値	11.5	2.607	15.6	0.736	16.2	1.198	79.0	0.071	51.0	0.620	7.9	0.044	7.0	0.067	5.2	0.855	6.198
平成27年6月度平均値	11.3	2.549	15.4	0.730	12.6	0.930	79.0	0.071	51.0	0.625	6.2	0.036	7.0	0.069	6.2	0.981	5.989
平成27年7月度平均値	11.0	2.540	15.2	0.687	16.4	1.190	79.0	0.069	51.0	0.617	5.8	0.036	7.0	0.066	5.9	0.927	6.202
平成27年8月度平均値																	
平成27年9月度平均値																	
平成27年10月度平均値																	
平成27年11月度平均値																	
平成27年12月度平均値																	
平成28年1月度平均値																	
平成28年2月度平均値																	
平成28年3月度平均値																	

二氧化硫黄の排出状況に関する事後調査結果(供用時)

時期	各煙突排出値																合計 二氧化硫黄排出量 m ³ /時
	1号煙突 調査地点1		2号煙突 調査地点2		3号煙突 調査地点3		4号煙突 調査地点4		5号煙突 調査地点5		6号煙突 調査地点6		7号煙突 調査地点7		8号煙突 調査地点8		
	濃度(ppm)	排出量(m ³ /時)															
第1期工事後計画値	0.3	0.112	11.8	0.639	0.2	0.012	0.9	0.0016	1.1	0.027	0.8	0.0034	0.9	0.0077	3.0	0.711	1.512
年度平均値	0.3	0.093	9.0	0.441	0.0	0.000	0.5	0.0004	0.5	0.006	0.4	0.0023	0.5	0.0048	0.9	0.149	0.684
平成27年4月度平均値	0.2	0.068	9.9	0.474	0.0	0.001	0.4	0.0004	0.4	0.005	0.4	0.0020	0.5	0.0044	0.9	0.149	0.704
平成27年5月度平均値	0.2	0.070	8.1	0.402	0.0	0.000	0.4	0.0004	0.5	0.005	0.4	0.0020	0.4	0.0043	0.9	0.149	0.633
平成27年6月度平均値	0.3	0.073	8.9	0.447	0.0	0.000	0.5	0.0004	0.6	0.006	0.4	0.0022	0.5	0.0049	1.0	0.154	0.686
平成27年7月度平均値	0.3	0.093	9.0	0.440	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.007	0.5	0.0029	0.6	0.0056	0.9	0.146	0.713
平成27年8月度平均値																	
平成27年9月度平均値																	
平成27年10月度平均値																	
平成27年11月度平均値																	
平成27年12月度平均値																	
平成28年1月度平均値																	
平成28年2月度平均値																	
平成28年3月度平均値																	

注：1. 非定常運転及び分析計欠測時のデータは除く。

2. 黄色で示す値については、一部の装置を停止した非定常運転のため参考値を記載する。

別紙2 窒素酸化物の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

平成27年 7月度 実績値

時期	各煙突排出値																合計 窒素酸化物排出量 m ³ /時
	1号煙突 調査地点1		2号煙突 調査地点2		3号煙突 調査地点3		4号煙突 調査地点4		5号煙突 調査地点5		6号煙突 調査地点6		7号煙突 調査地点7		8号煙突 調査地点8		
	濃度(ppm)	排出量(m ³ /時)															
第1期工事後計画値	12.7	3.300	25.9	1.337	9.1	0.665	85.0	0.137	83.0	10.0	0.051	10.0	0.086	11.3	2.888	10.766	
参考(平均値:注6)	11.5	2.571	15.2	0.687	15.8	1.129	79.0	0.069	51.0	0.617	6.5	0.033	6.7	0.063	6.3	1.032	6.202
参考(最大値:注6)	19.3	3.813	22.7	0.894	21.9	1.497	79.0	0.072	51.0	0.648	12.0	0.041	7.0	0.075	7.2	1.185	7.535
平均値(注7)	11.0	2.540	15.2	0.687	16.4	1.190	79.0	0.069	51.0	0.617	5.8	0.036	7.0	0.066	5.9	0.927	—
最大値(注7)	11.0	2.540	22.7	0.894	21.9	1.497	79.0	0.072	51.0	0.648	6.5	0.041	7.0	0.075	6.2	1.043	—
1日	10.3	2.092	20.8	0.803	7.6	0.482	79.0	0.061	51.0	0.504	11.8	0.010	7.0	0.067	5.9	0.851	4.870
2日	12.1	2.042	22.7	0.864	19.8	1.316	79.0	0.060	51.0	0.497	12.0	0.010	7.0	0.069	5.6	0.805	5.662
3日	19.3	3.813	22.4	0.837	20.1	1.397	79.0	0.062	51.0	0.515	12.0	0.011	7.0	0.069	5.6	0.832	7.535
4日	11.4	2.520	18.4	0.817	20.8	1.497	79.0	0.072	51.0	0.636	7.7	0.025	7.0	0.070	5.8	0.922	6.560
5日	11.0	2.540	18.6	0.894	20.1	1.357	79.0	0.072	51.0	0.637	5.8	0.037	7.0	0.066	5.9	0.958	6.560
6日	11.1	2.530	17.2	0.833	14.7	1.094	79.0	0.072	51.0	0.648	5.8	0.037	7.0	0.070	5.8	0.930	6.214
7日	11.3	2.558	16.0	0.767	15.3	1.160	79.0	0.071	51.0	0.637	5.8	0.037	7.0	0.067	6.1	0.932	6.229
8日	11.2	2.583	15.6	0.740	15.4	1.159	79.0	0.070	51.0	0.639	5.9	0.038	7.0	0.066	6.0	0.927	6.221
9日	11.3	2.609	15.9	0.758	19.8	1.489	79.0	0.070	51.0	0.635	5.8	0.036	7.0	0.068	6.0	0.943	6.607
10日	11.3	2.585	15.3	0.728	15.7	1.181	79.0	0.069	51.0	0.629	5.7	0.036	7.0	0.067	6.1	0.981	6.276
11日	11.3	2.569	15.2	0.716	17.4	1.308	79.0	0.070	51.0	0.638	5.6	0.035	7.0	0.068	6.0	1.002	6.406
12日	11.2	2.508	15.4	0.724	17.3	1.290	79.0	0.069	51.0	0.632	5.8	0.036	7.0	0.063	6.2	1.043	6.366
13日	11.3	2.597	15.1	0.711	16.0	1.185	79.0	0.069	51.0	0.640	5.8	0.035	7.0	0.064	7.2	1.185	6.486
14日	11.3	2.602	14.6	0.688	13.0	0.972	79.0	0.069	51.0	0.634	5.6	0.035	7.0	0.064	6.4	1.061	6.125
15日	11.2	2.520	14.6	0.690	14.3	1.073	79.0	0.069	51.0	0.630	6.2	0.038	7.0	0.064	6.4	1.098	6.182
16日	10.7	2.427	14.5	0.686	15.1	1.123	79.0	0.070	51.0	0.623	5.8	0.037	7.0	0.072	6.4	1.146	6.185
17日	10.9	2.524	13.9	0.655	14.8	1.098	79.0	0.071	51.0	0.620	5.6	0.036	7.0	0.075	6.4	1.122	6.201
18日	11.3	2.545	13.3	0.621	13.4	1.005	79.0	0.070	51.0	0.612	6.0	0.038	7.0	0.074	6.4	1.146	6.112
19日	11.2	2.469	13.4	0.625	16.8	1.256	79.0	0.071	51.0	0.636	6.5	0.041	7.0	0.068	6.4	1.146	6.312
20日	11.3	2.524	13.8	0.632	17.8	1.322	79.0	0.070	51.0	0.632	6.2	0.034	7.0	0.065	6.4	1.137	6.416
21日	11.4	2.607	14.0	0.595	16.8	1.248	79.0	0.069	51.0	0.615	6.3	0.031	7.0	0.062	6.5	1.079	6.305
22日	11.5	2.730	14.1	0.584	14.6	1.089	79.0	0.070	51.0	0.591	6.1	0.039	7.0	0.067	6.5	1.027	6.196
23日	11.5	2.749	14.0	0.599	14.8	1.118	79.0	0.069	51.0	0.603	5.9	0.036	7.0	0.069	6.5	1.037	6.280
24日	11.3	2.603	13.4	0.614	16.0	1.208	79.0	0.069	51.0	0.629	5.9	0.035	7.0	0.064	6.4	1.061	6.283
25日	11.3	2.572	13.4	0.619	17.2	1.295	79.0	0.070	51.0	0.629	5.8	0.035	7.0	0.065	6.5	1.085	6.368
26日	11.3	2.553	13.2	0.607	15.9	1.190	79.0	0.070	51.0	0.635	5.9	0.036	7.0	0.064	6.5	1.095	6.250
27日	11.4	2.568	13.2	0.611	21.9	1.395	79.0	0.069	51.0	0.624	5.7	0.035	7.0	0.055	6.5	1.094	6.451
28日	11.3	2.527	13.2	0.608	18.0	1.056	79.0	0.069	51.0	0.630	5.7	0.037	7.0	0.054	6.5	1.117	6.099
29日	11.3	2.535	12.9	0.592	16.6	1.007	79.0	0.069	51.0	0.632	5.8	0.037	7.0	0.057	6.5	1.110	6.040
30日	11.4	2.546	12.6	0.563	12.2	0.637	79.0	0.068	51.0	0.632	5.7	0.036	7.0	0.057	6.5	1.093	5.609
31日	11.7	2.567	11.9	0.513	0.2	0.002	79.0	0.069	51.0	0.646	5.8	0.038	7.0	0.065	6.5	1.028	4.862

- 注：1. 排出濃度及び排出量は1日平均値を示す。
 2. 高度化後には、表中の第1期工事後計画値を高度化後計画値に変更し、「評価書」高度化後の記載値（計画値）を記入する。
 3. 事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。
 4. 窒素酸化物濃度は酸素濃度4%換算値を示す。
 5. 第1期工事後計画値は平成17年度実績値（年平均値）を基に第1期工事後を予測した値を示す。
 6. 参考欄は、表中の全数値を対象とする。
 7. 平均値と最大値の欄は、非定常運転のデータ及び分析計欠測時のデータを除く。
 8. 赤色で示すデータについては、分析計の点検による分析計の欠測データを含む。
 9. 黄色で示す値については、一部の精製装置を停止操作した非定常運転である。

別紙3 二酸化硫黄の排出状況に関する事後調査結果（供用時）

平成27年 7月度 実績値

時期	各煙突排出値																合計 二酸化硫黄排出量 m ³ /時
	1号煙突 調査地点1		2号煙突 調査地点2		3号煙突 調査地点2		4号煙突 調査地点4		5号煙突 調査地点5		6号煙突 調査地点6		7号煙突 調査地点7		8号煙突 調査地点8		
	濃度(ppm)	排出量 (m ³ /時)															
第1期工事後計画値	0.3	0.112	11.8	0.639	0.2	0.012	0.9	0.0016	1.1	0.027	0.8	0.0034	0.9	0.0077	3.0	0.711	1.512
参考(平均値:注5)	0.3	0.098	9.1	0.446	0.0	0.001	0.6	0.0005	0.7	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0054	0.9	0.153	0.713
参考(最大値:注5)	0.4	0.124	11.4	0.573	0.3	0.028	0.7	0.0007	0.8	0.009	0.8	0.0040	0.6	0.0066	1.1	0.167	0.851
平均値(注6)	0.3	0.093	9.0	0.440	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.007	0.5	0.0029	0.6	0.0056	0.9	0.146	—
最大値(注6)	0.3	0.093	11.4	0.573	0.1	0.005	0.7	0.0007	0.8	0.009	0.7	0.0037	0.6	0.0066	1.1	0.162	—
1日	0.3	0.074	4.7	0.222	0.1	0.005	0.6	0.0005	0.7	0.006	0.5	0.0007	0.6	0.0064	1.1	0.162	0.477
2日	0.3	0.075	4.6	0.213	0.0	0.000	0.5	0.0004	0.7	0.006	0.5	0.0007	0.6	0.0064	0.9	0.129	0.430
3日	0.4	0.102	5.0	0.225	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.006	0.5	0.0007	0.6	0.0064	0.9	0.135	0.475
4日	0.3	0.101	7.8	0.380	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.007	0.5	0.0019	0.6	0.0066	0.9	0.147	0.644
5日	0.3	0.093	8.1	0.425	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.6	0.0064	0.9	0.150	0.685
6日	0.3	0.093	8.9	0.462	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.6	0.0065	0.9	0.148	0.720
7日	0.3	0.093	9.3	0.477	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0028	0.6	0.0061	0.9	0.141	0.728
8日	0.3	0.095	9.5	0.487	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0028	0.6	0.0056	0.9	0.141	0.739
9日	0.3	0.095	9.6	0.495	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0054	0.9	0.144	0.749
10日	0.3	0.094	9.6	0.485	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0053	0.9	0.146	0.740
11日	0.3	0.093	8.7	0.436	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0054	0.9	0.150	0.694
12日	0.3	0.092	9.1	0.455	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0050	0.9	0.154	0.717
13日	0.3	0.093	9.4	0.469	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0027	0.5	0.0051	0.9	0.149	0.727
14日	0.3	0.094	9.7	0.484	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0026	0.5	0.0052	0.9	0.148	0.742
15日	0.3	0.092	10.7	0.533	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.007	0.5	0.0026	0.5	0.0052	0.9	0.157	0.799
16日	0.3	0.094	11.4	0.573	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.5	0.0026	0.5	0.0061	0.9	0.167	0.851
17日	0.4	0.108	10.5	0.526	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.6	0.0032	0.6	0.0065	0.9	0.162	0.814
18日	0.4	0.114	10.5	0.521	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.7	0.0037	0.6	0.0064	0.9	0.166	0.819
19日	0.4	0.110	10.1	0.499	0.0	0.000	0.6	0.0005	0.7	0.008	0.6	0.0036	0.5	0.0056	0.9	0.164	0.791
20日	0.4	0.112	9.2	0.447	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.7	0.0032	0.5	0.0052	0.9	0.161	0.737
21日	0.4	0.124	9.5	0.434	0.0	0.000	0.7	0.0006	0.8	0.008	0.8	0.0034	0.5	0.0050	0.9	0.149	0.724
22日	0.4	0.122	9.1	0.408	0.0	0.000	0.7	0.0007	0.8	0.009	0.7	0.0040	0.5	0.0057	0.9	0.141	0.690
23日	0.4	0.106	9.2	0.423	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.5	0.0029	0.5	0.0059	0.9	0.145	0.691
24日	0.3	0.099	9.8	0.473	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0025	0.5	0.0054	0.9	0.154	0.742
25日	0.3	0.097	10.6	0.518	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0026	0.5	0.0055	1.0	0.159	0.789
26日	0.3	0.095	10.3	0.500	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0026	0.5	0.0054	1.0	0.160	0.771
27日	0.3	0.090	10.0	0.487	0.0	0.000	0.6	0.0006	0.7	0.008	0.5	0.0027	0.6	0.0048	1.0	0.163	0.756
28日	0.3	0.091	9.7	0.473	0.3	0.028	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0028	0.6	0.0047	1.0	0.167	0.774
29日	0.3	0.093	9.9	0.479	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.5	0.0028	0.5	0.0048	1.0	0.166	0.753
30日	0.3	0.096	9.2	0.432	0.1	0.003	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.6	0.0032	0.5	0.0023	0.9	0.159	0.703
31日	0.3	0.095	8.4	0.380	0.0	0.000	0.5	0.0005	0.6	0.007	0.6	0.0035	0.0	0.0000	0.9	0.147	0.633

- 注：1. 排出濃度及び排出量は1日平均値を示す。
 2. 高度化後には、表中の第1期工事後計画値を高度化後計画値に変更し、「評価書」高度化後の記載値（計画値）を記入する。
 3. 事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。
 4. 第1期工事後計画値は平成17年度実績値（年平均値）を基に第1期工事後を予測した値を示す。
 5. 参考欄は、表中の全数値を対象とする。
 6. 平均値と最大値の欄は、非正常運転のデータ及び分析計欠測時のデータを除く。
 7. 赤色で示すデータについては、分析計の点検による分析計の欠測データを含む。
 8. 黄色で示す値については、一部の精製装置を停止操作した非正常運転である。

別紙4 排水水質の状況に関する事後調査結果（新設排水処理施設出口：供用時）

平成27年度平均値

時期	新設排水処理実績値							
	新設排水処理施設出口 調査地点12							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		全窒素		全磷	
m ³ /日	—	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	
計画値	3,960	6.0-8.0	6.0	23.8	5	19.8	0.07	0.3
年度平均値	2,846	7.2	3.6	10.1	3	7.3	0.02	0.1
平成27年4月度平均値	2,671	6.8	3.4	9.0	2	5.6	0.01	0.0
平成27年5月度平均値	2,873	6.8	3.4	9.8	3	7.9	0.01	0.0
平成27年6月度平均値	2,886	7.5	3.7	10.6	2	7.1	0.03	0.1
平成27年7月度平均値	2,952	7.8	3.8	11.0	3	8.8	0.05	0.1
平成27年8月度平均値								
平成27年9月度平均値								
平成27年10月度平均値								
平成27年11月度平均値								
平成27年12月度平均値								
平成28年1月度平均値								
平成28年2月度平均値								
平成28年3月度平均値								

平成27年 7月度

日	新設排水処理実績値							
	新設排水処理施設出口 調査地点12							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		全窒素		全磷	
m ³ /日	—	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	
計画値	3,960	6.0-8.0	6.0	23.8	5	19.8	0.07	0.3
参考(平均値)(注3)	2,952	7.8	3.8	11.2	3	8.2	0.05	0.1
参考(最大値)(注3)	3,408	8.3	6.5	20.3	4	11.6	0.19	0.6
平均値(注4)	2,952	7.8	3.8	11.0	3	8.8	0.05	0.1
最大値(注4)	3,408	8.3	5.9	17.9	4	11.6	0.19	0.6
1日	2,856	7.9	3.6	10.2	2	6.3	0.03	0.1
2日	2,814	7.9	3.6	10.0	2	5.0	0.03	0.1
3日	2,855	7.9	3.7	10.7	2	6.5	0.04	0.1
4日	2,877	7.9	3.7	10.5	3	9.3	0.05	0.1
5日	2,898	7.8	3.4	9.9	2	7.2	0.06	0.2
6日	2,853	7.9	3.4	9.8	2	6.7	0.07	0.2
7日	2,914	7.9	3.6	10.6	3	8.3	0.08	0.2
8日	2,745	7.9	3.6	9.8	2	6.2	0.06	0.2
9日	2,870	7.8	3.6	10.4	3	8.6	0.09	0.2
10日	2,974	7.9	3.8	11.2	3	8.7	0.09	0.3
11日	2,960	8.3	3.4	10.1	3	8.1	0.05	0.1
12日	2,872	8.0	3.4	9.7	3	9.5	0.03	0.1
13日	2,893	7.5	3.3	9.6	4	11.3	0.01	0.0
14日	2,909	7.6	3.2	9.3	4	10.3	0.01	0.0
15日	2,883	7.6	3.4	9.8	3	9.6	0.02	0.1
16日	3,038	7.7	3.3	10.0	3	8.3	0.04	0.1
17日	3,120	7.7	3.3	10.2	3	8.4	0.04	0.1
18日	3,290	7.7	3.4	11.3	2	7.1	0.05	0.2
19日	3,158	7.6	3.2	10.2	2	7.8	0.01	0.0
20日	3,152	7.6	3.3	10.3	3	8.7	0.01	0.0
21日	2,964	7.7	3.4	10.0	3	9.2	0.01	0.0
22日	2,963	7.8	2.3	6.8	4	11.0	0.00	0.0
23日	3,044	7.7	5.9	17.9	3	8.8	0.00	0.0
24日	3,145	7.6	6.5	20.3	3	9.5	0.04	0.1
25日	3,149	7.6	5.1	16.1	4	11.4	0.18	0.6
26日	2,981	7.6	4.9	14.6	3	10.0	0.19	0.6
27日	2,183	7.6	4.7	10.2	4	9.8	0.07	0.2
28日	2,622	7.7	3.8	10.1	4	11.6	0.01	0.0
29日	3,222	8.1	3.9	12.6	2	5.7	0.02	0.1
30日	2,909	8.1	3.9	11.2	0	0.3	0.00	0.0
31日	3,408	8.3	4.1	13.8	1	4.3	0.03	0.1

注：1. 事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

2. 排水性状値については自動分析計の日間平均値を記載。

3. 参考欄は、表中の全数値を対象とする。

4. 平均値と最大値の欄は、新設排水処理施設停止時と非常運転のデータ及び分析計欠測時のデータを除く。

5. 赤字の値については、分析計の点検による分析計の欠測データ及び分析計の指示不良を含む。

別紙5 排水水質の状況に関する事後調査結果 (No.1排水口出口：供用時)

第1期工事後

時期	実績値							
	No.1排水口 調査地点11							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		窒素含有量		燐含有量	
m ³ /日	—	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	
計画値 (第1期工事後)	21,891	6.0-8.0	6.5	142.3	5	109.5	0.07	1.5
年度平均値	15,125	7.5	5.4	81.3	3	44.8	0.03	0.5
平成27年4月度	15,326	7.4	6.2	95.0	3	46.0	0.03	0.5
平成27年5月度	14,205	7.6	5.3	75.3	4	56.8	0.03	0.4
平成27年6月度	14,546	7.5	4.9	71.3	3	43.6	0.04	0.6
平成27年7月度	16,421	7.6	5.1	83.7	2	32.8	0.03	0.5
平成27年8月度								
平成27年9月度								
平成27年10月度								
平成27年11月度								
平成27年12月度								
平成28年1月度								
平成28年2月度								
平成28年3月度								

- 注：1. 事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。
 2. 水素イオン濃度、化学的酸素要求量の性状値については1回/週の測定値の平均値を示す。
 3. 窒素含有量、燐含有量の性状値については1回/月の測定値を示す。

別紙6 排水水質の状況に関する事後調査結果 (No. 3排水口出口 : 供用時)

第1期工事後

時期	実績値							
	No. 3排水口 調査地点10							
	排水量	水素イオン濃度	化学的酸素要求量		窒素含有量		燐含有量	
m ³ /日	—	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	濃度 mg/L	汚濁負荷量 kg/日	
計画値 (第1期工事後)	215	6.0-8.0	6.9	1.5	3	0.6	0.3	0.1
年度平均値	172	7.8	5.1	0.9	2	0.3	0.1	0.0
平成27年4月度	195	7.8	5.2	1.0	1	0.2	0.1	0.0
平成27年5月度	172	7.8	4.5	0.8	2	0.3	0.1	0.0
平成27年6月度	166	7.8	5.5	0.9	2	0.3	0.1	0.0
平成27年7月度	155	7.7	5.3	0.8	1	0.2	0.1	0.0
平成27年8月度								
平成27年9月度								
平成27年10月度								
平成27年11月度								
平成27年12月度								
平成28年1月度								
平成28年2月度								
平成28年3月度								

注：1. 事後調査は第1期工事後5年間及び高度化後5年間実施する。

2. 水素イオン濃度、化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量の性状値については1回/月の測定値を示す。
