



# 企業の森～向井池東側園路の整備について

(平成27年度 向井池東側園路基本設計 計画平面図)

協議 3

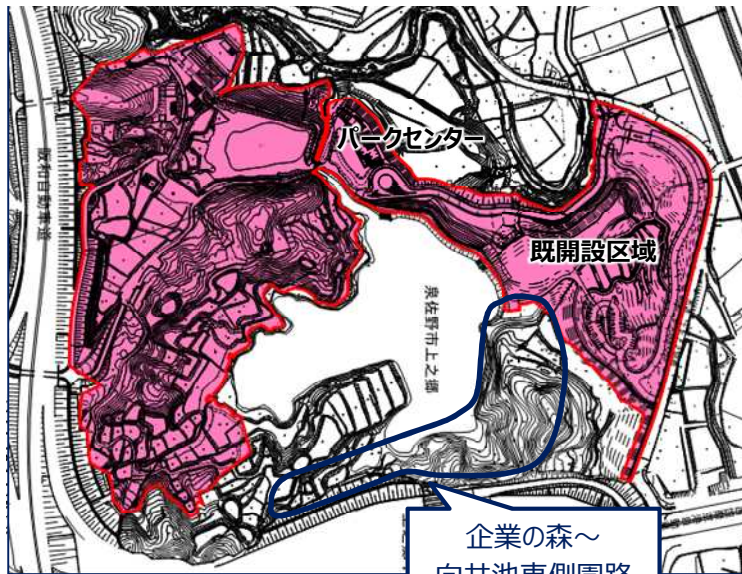

企業の森～  
向井池東側園路

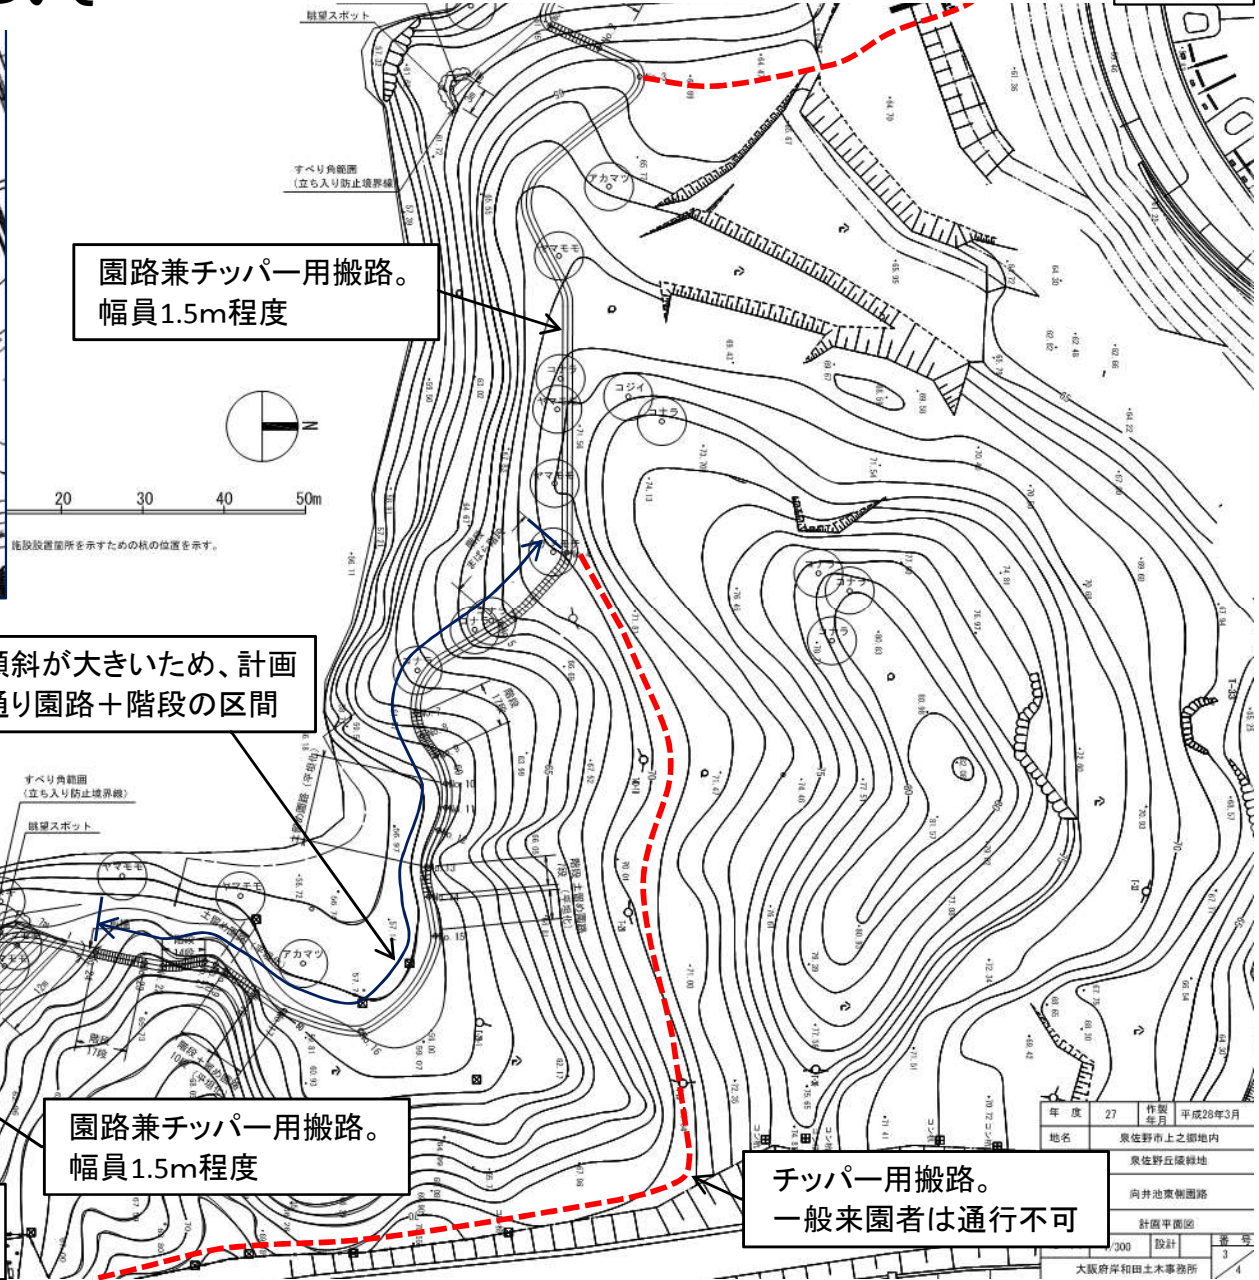

園路兼チップ用搬路。  
幅員1.5m程度

傾斜が大きいため、計画  
通り園路+階段の区間

階段をスロープに変更  
(一部幅員拡幅)

園路兼チップ用搬路。  
幅員1.5m程度

チップ用搬路。  
一般来園者は通行不可

平成28年度工事予定  
(有刺鉄線柵取り替え)

年度	27	作業 年月	平成26年3月
地名	泉佐野市上之郷地内 泉佐野五園緑地 向井池東側園路		
計画平面図	300	設計	3

大阪府岸和田土木事務所



# 企業の森～向井池東側園路の整備について

企業の森～向井池東側園路付近において、維持管理作業で伐竹した竹が搬出できず、竹林内に集積もしくは放置せざるを得ない状況となっている。今後、この区域を開闢した後も伐竹は必要不可欠な維持管理作業であるため、チップperを運搬できるルートを作り、良好な維持管理作業ができるようにしたい。

協議 3



→ 現況では伐竹したものを集積している場所となっている



→ 山側の枯竹を境界沿いでチップper化した後、チップperを下すことができるルートを整備し、その後池周辺の竹をチップper化



→ 竹以外の既存木も整理が必要



→ チップperを運搬できるように、④-1の部分は斜度が緩くなるように削る



→ チップperを運搬できるように、④-2の部分は段を削って幅員を拡幅する



→ 高速道路への倒竹防止も兼ねて、境界沿いにチップperが通れる程度の幅の通路を整備

<span style="color: green;">— — —</span>	園路 (人のみ)
<span style="color: orange;">— — —</span>	園路兼チップper搬路
<span style="color: blue;">— — —</span>	チップper用搬路
<span style="color: red;">— — —</span>	既存園路兼チップper搬路
