

新規事業評価調査書

事業名	大阪府営枚方交北第2住宅建替事業	
担当部署	住宅まちづくり部住宅経営室住宅企画課計画グループ(連絡先 06-6944-6125)	
事業箇所	枚方市交北3丁目	
事業概要	目的	<p>本事業は、住宅に困窮する低所得者の居住の安定の確保のため行うものである。昭和43,44,48,49年度に建設された本住宅は、耐震性の低いラーメン構造と壁式構造が混在する住宅であり、耐震性の低いラーメン構造の住棟の建替事業を実施する。これにより、屋内外のバリアフリー化や耐震性の向上、及びオープンスペースの確保など良好な住宅及び住環境を整備する。</p> <p>本事業は、耐震性の低いラーメン構造の住棟の区域を建替対象区域としており、耐震性が確保されている建替対象外区域については、中層エレベーター設置などによりバリアフリー化等を進める。事業手法は、民間事業者により、府営住宅の建替えと建替えにより生み出された用地(活用用地)の活用を一体的に行う民活手法を予定している。</p>
	内容	<p>【現況】 敷地面積：約2.0ha(団地全体：11.8ha) 管理戸数：320戸(団地全体：1,270戸) 構造：中層耐火5F 建設年度：昭和43年度 住戸面積：約46~66㎡ 住戸タイプ：2K~3LDK</p> <p>【建替計画】敷地面積：約2.0ha(府営住宅及び活用用地の合計) 戸数：320戸 構造：耐火構造 住戸面積：約36㎡~72㎡ 住戸タイプ：1DK~4DK</p> <p>(参考) 区域区分・用途地域：第1種中高層住居専用地域 指定容積率：200% 指定建ぺい率：60%</p>
	事業費	<p>総事業費：約54.6億円(府が直接実施する場合) (内訳)調査費等：約1.8億円 補償費：約7.2億円 工事費：約45.6億円 (建設工事単価 約16万円/㎡)</p>
	維持管理費	<p>想定必要維持管理費：12.9億円(府が直接実施する場合) 「公営住宅改善手法選択マニュアル」により、耐用年数70年間分の維持管理費を現在価値化して算出した金額。</p>
	関連事業	用地活用事業
	事業手法	<p>民間事業者が、府が示す募集要項に従い、区域全体について府営住宅建替と用地活用を一体的に行う土地利用計画を提案する。これに基づき、府営住宅を設計、施工し、完成後に府へ売却する。また、活用用地を府から買い取り、民間施設等の整備を行う。(民活手法)今後、府営住宅建替の基本的な考え方が本事業についても反映されるよう実施方針等を作成する。</p>
	上位計画等の位置づけ	<p>大阪府住宅まちづくりマスタープラン(H19.3) 大阪府営住宅ストック総合活用計画(H19.1)</p>


優先度	大阪府住宅まちづくりマスタープランにおいては、「真に住宅に困窮する府民の居住の安定の確保という観点から公営住宅を公平に供給する」ことや、「原則として新たな供給を行わず、これまで蓄積してきた府営住宅ストックを有効活用していく」こと、大阪府営住宅ストック総合活用計画においては、「中層耐火住宅」については、老朽化が著しく居住水準の低い昭和20・30年代に建設されたものや、昭和40年代の耐震性の低いものを中心に建替えを行う」ことなどを位置づけている。	
事業の進捗予定	事業段階ごとの進捗予定と効果	<p>【予定年度】平成21年度 事業コンペ実施 平成22年度 設計・入居者移転・工事施工 平成25年度 工事完了・府営住宅の買取り・入居</p> <p>【効果】・住宅に困窮する低所得者の居住の安定の確保 ・老朽化した住宅の更新による良質な住宅の供給及び住環境の向上 〔民活手法を用いて、民間事業者から魅力あるまちづくり、効率的な事業手法の提案を受け、老朽化した住宅の更新を行い、住宅及び住環境の向上を図る。〕</p>
	完成予定年	平成25年度
事業を巡る社会経済情勢	事業目的に関する諸状況	<p>【住宅及び住環境の状況】 事業対象住棟は、昭和43年度に建設され、住棟は耐震性が低いラーメン構造となっている。 現在、全住戸の約36.1%で65歳以上の高齢者を含む世帯が入居しており、今後も一層の高齢化が予想される中、今回の建替対象区域では、全ての住棟でエレベーターが設置されておらず、階段による昇降であり、高齢化対応ができていない。 これら住宅及び住環境の向上への対応が必要となっている。</p> <p>【コスト縮減】 大阪府は、財政緊迫の状況下であり、今後も継続してコスト縮減が求められている。 この民活手法は、民間活力を導入し、計画から施工まで一括して、仕様を限定せずに発注することにより、効率化やコスト縮減を図るものである。</p>
	地元等の協力度	平成19年度末時点で、99.7%の入居者から建替についての同意を得たが、残る入居者についても同意取得に努める。

事業効果の定量的分析	費用便益分析	具体的な便益内容	受益者	費用便益比	備考
		住宅に困窮する世帯が、品質・機能・安全性等について一定水準を満足する住宅に、低廉な家賃で居住できるという居住水準向上効果。	府民	B / C = 1.40 便益総額 B = 74.0 億円 総費用 C = 53.0 億円	・国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により、算出している。 ・この評価手法では、建替事業の評価に当っては「福祉的役割」「安全確保役割」「居住水準向上効果」「地域波及効果」「政策誘導効果」の5項目を総合的に評価することとなっている。このうち数値化の可能な「居住水準向上効果」のみB / Cとしている。
その他の指標 (代替指標)	当該住宅の位置する枚方市域の府営住宅の平均応募倍率(H16~18年)は、9.0倍で公営住宅需要がある。 (参考/府営住宅全体の平均応募倍率(H16~18年)12.1倍)				
事業効果の定性的分析	安全・安心	住宅の供給	適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅に困窮する世帯の居住の安定を図る。		
		事故防止	事故の防止に配慮し、段差解消や手すりの設置など、住戸内だけでなく、団地内通路等屋外についてもバリアフリー化に努め、安全で安心して暮らせる生活の場を提供する。		
		防災	住宅を建替え、耐震性の向上を図る。また、高度利用等による土地の有効活用により、基準に対して十分なオープンスペースを確保し、地域全体の防災性の向上に寄与する。		
	活力	コミュニティの活性化	住民の交流の場となる公園を整備するとともに、活用用地においては、地元市と調整しながら、多様な住宅や地域の活性化につながる施設の導入を図ることで、周辺地域を含めたコミュニティの活性化に寄与する。		
	快適性	住環境の形成	敷地内の緑地は、防犯に配慮しながらできるだけ保全し、団地南側に隣接する交北公園との緑地やオープンスペースの連続性に配慮し、歩行者動線のネットワーク化に努め、より快適で良好な住環境の形成を図る。		
その他	一体的なまちづくり	府営住宅と用地活用を併せた土地利用計画の民間提案により、連続性のあるオープンスペースの確保など一体的なまちづくりが期待できる。			

自然環境等への影響と対策	【緑化の推進】 建替えにあたっては、府自然環境保全条例で規定される敷地面積の20%以上の緑地を確保することとし、緑の創出や自然環境の回復に努め、良好な住環境の形成を図る。また、整備後の緑地の適切な管理育成にも配慮する。
	【産業廃棄物のリサイクル】 従前住宅の撤去工事に伴う廃棄物については、「建設リサイクル法」に基づき、建設資材としてリサイクルが可能なものについて再資源化に努める。また、新築工事においては、再生材の利用に努めていく。
代替案との比較検討	改善等 耐震改修の実施には、増築部分の撤去が必要となる等の課題が考えられるのに加え、躯体の耐用年数は延びない。現在の標準仕様である「あいあい住宅」相当となるよう、バリアフリー化やEV増築などの改善事業を実施したとしても、全ての部分のバリアフリー化はできず、また、当時の建築計画では設備改修が困難であることから、効率的な修繕ができないため、改善等による方法は効果的でない。 他団地への集約建替 同一生活圏内の他の府営住宅で、本団地を集約できる程度の規模を持つものが存在しないため、他団地への集約建替は困難である。
	その他特記すべき事項




付近見取り図

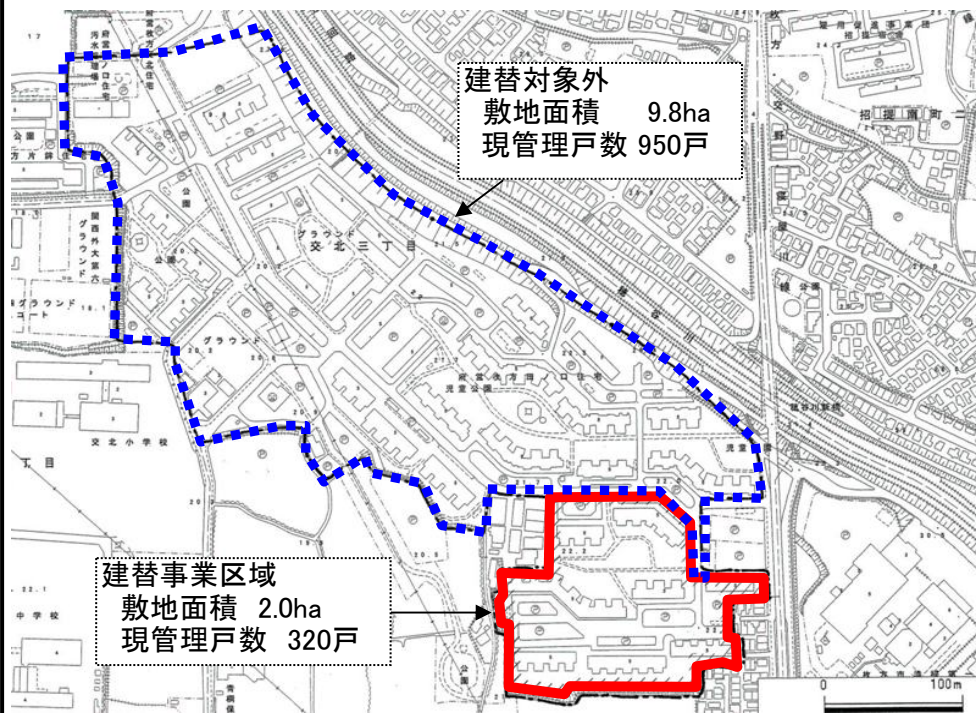

敷地現況図

団地全体
敷地面積 11.8ha, 現管理戸数 1270戸

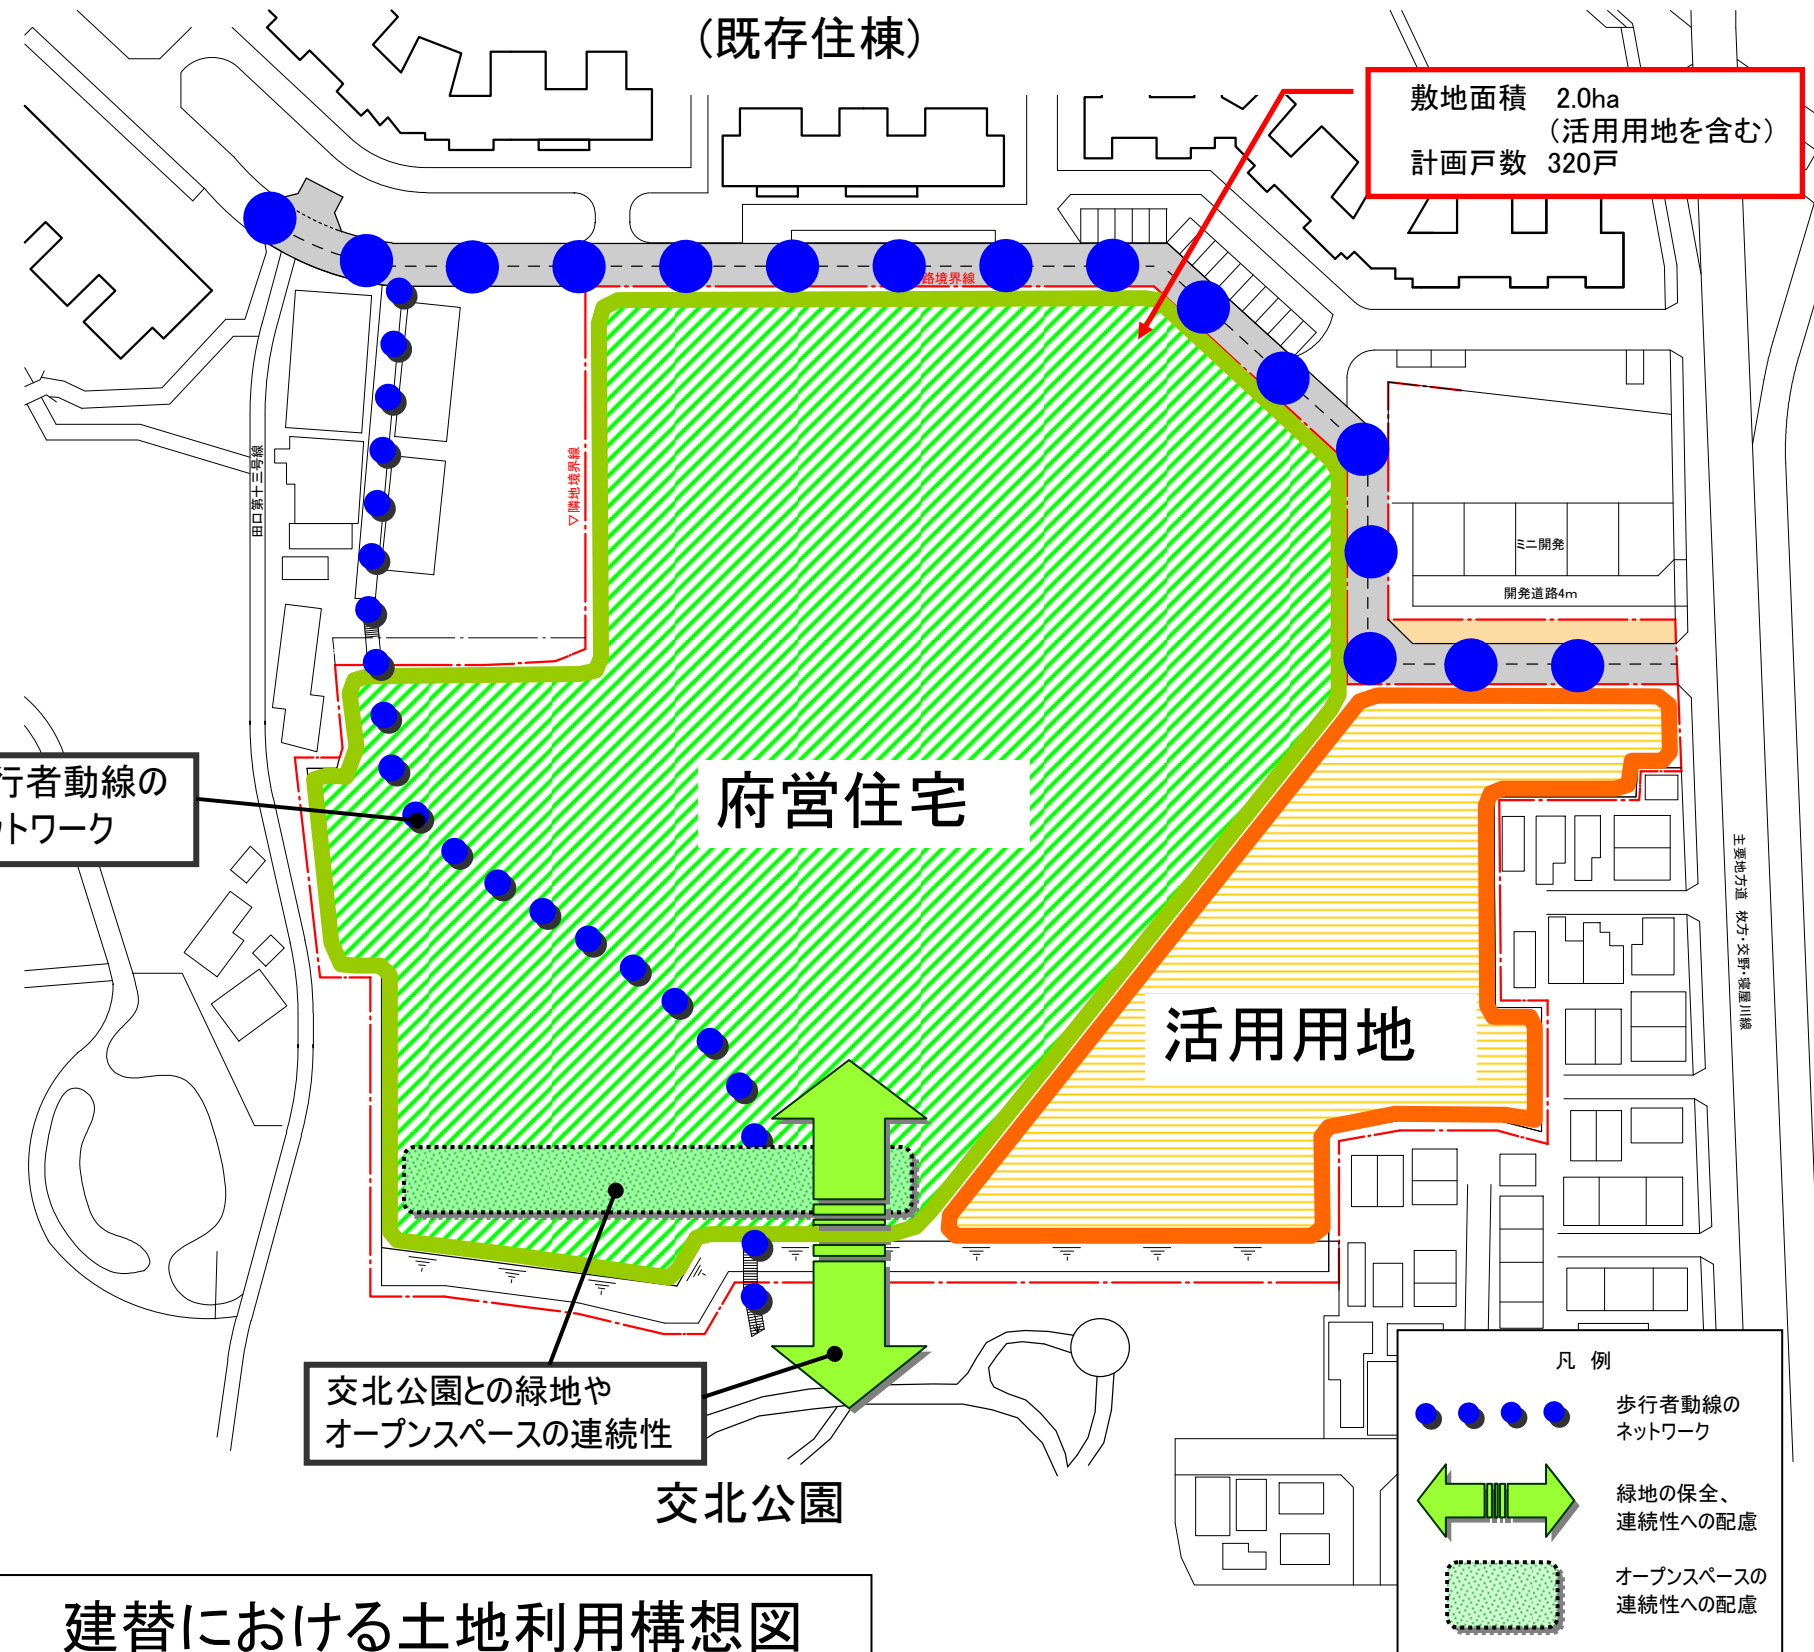

建替における土地利用構想図



枚方交北第2住宅
