京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所
昼間(平日)０７２－８０２－３１６７
夜間・休日０７２－８０２－３１６７
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第2工区　2026年4月分
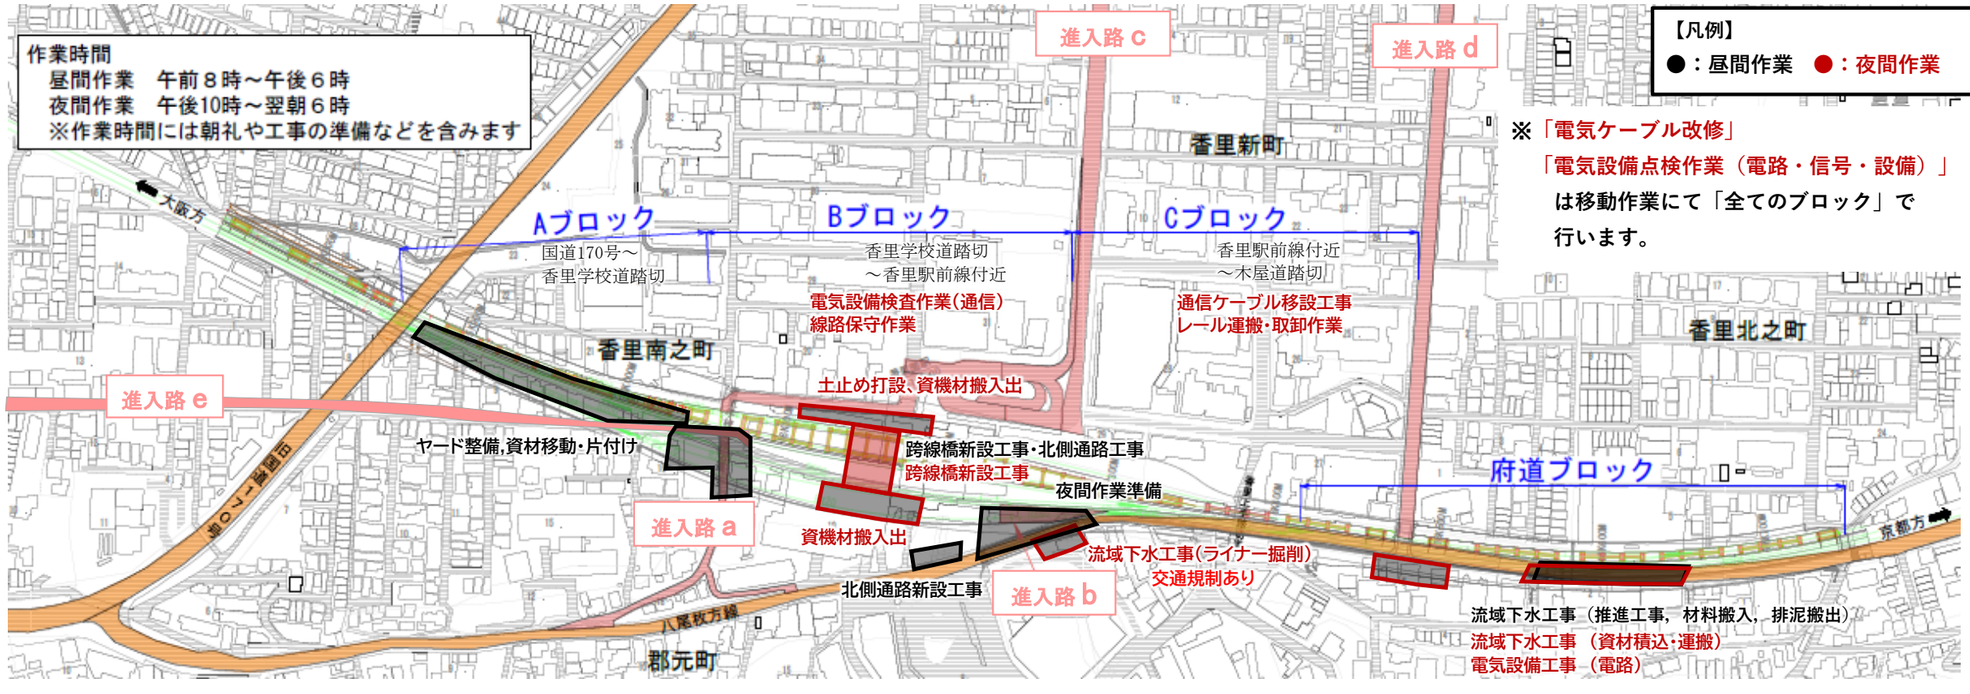
				2026年3月							2026年4月																										2026年5月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	全ブロック	昼間	電気ケーブル改修																											●																		
			[使用する進入路]																											cd																		
		夜間	電気ケーブル改修	●		●				●	●		●				●		●						●						●		●				●											
			[使用する進入路]	cd		cd				cd	cd		cd				cd		cd						cd						cd		cd				cd											
	A ブロック	昼間	ヤード整備, 資材移動・片付け	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●			●	●							
			[使用する進入路]	a,b,e							a,b,e																																				
	B ブロック	昼間	流域下水工事（夜間作業準備）	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●			●	●						
			[使用する進入路]	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b			b	b						
		夜間	流域下水工事（到達立坑ライナー掘削）	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●				●	●						
			[使用する進入路]	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b				b	b						
		昼間	跨線橋工事、北側通路工事	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●						
			[使用する進入路]	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc			b	b						
		夜間	跨線橋工事、資機材搬入出、土止打設		●							●							●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●							●	●						
			[使用する進入路]		b							bc							bc	bc				b	b	b	b			b	b	b	b	b							b	b						
	C ブロック	夜間	通信ケーブル移設工事													●																	●														
			[使用する進入路]													cd																	cd														
	府道ブロック	昼間	流域下水工事（推進工事）	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●						
			[使用する進入路]																																												
		夜間	流域下水工事（資材積込運搬）	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●				●	●						
			[使用する進入路]	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b			b				b	b						
			電気設備工事(電路)														●																														
			[使用する進入路]														b																														
その他工事（一般保守作業）	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(電路, 信号, 設備)		●				●	●						●				●	●		●	●						●			●				●	●									
	Bブロック	夜間	電気設備検査作業（通信）																				●																								
			線路保守作業																														●														
	Cブロック	夜間	レール運搬・取卸作業																						●
