京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所
昼間(平日)０７２－８０２－３１６７
夜間・休日０７２－８０２－３１６７
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第2工区　2026年7月分

				2026年6月							2026年7月																													2026年8月						
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	全ブロック	夜間	電気ケーブル改修		●				●				●				●		●						●		●				●						●		●		●							
			［使用する進入路］		cd				cd				cd				cd		cd						cd		cd				cd						cd		cd		cd							
			電気設備工事(設備)								●		●				●																				●		●								
			［使用する進入路］								a,b,c,d																										a,b,c,d										
	A ブロック	昼間	支障物撤去工事	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			［使用する進入路］		a,b,e				a,e				a,e				a,e								a,e							a,e						a,e										
		夜間	大型重機搬入出工事		●																												●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	
			［使用する進入路］		b																												b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	
	B ブロック	昼間	流域下水工事（推進工事）																												●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
			［使用する進入路］																												b	b	b	b	b		b	b	b	b	b	b		b	b	b	b	b
		夜間	流域下水工事（推進工事）																												●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	
			［使用する進入路］																												b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	
		昼間	跨線橋工事、東側ｺﾝｺｰｽ工事、北側通路工事	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			［使用する進入路］	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc
		夜間	資機材搬入出工事	●	●	●																				●	●				●	●									●	●						
			［使用する進入路］	bc	bc	bc																				b	b				b	b									b	b						
		昼間	既存駅舎電気設備支障移転工事								●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●							
			［使用する進入路］								B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B							
	府道 ブロック	昼間	流域下水工事（推進工事）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			［使用する進入路］	b	b	b	b		b	b	b	b	b	b		b	b	b	b	b	b		b	b	b	b	b	b			b	b	b	b	b		b	b	b	b	b			b	b	b	b	b
		夜間	流域下水工事（推進工事）																												●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	
			［使用する進入路］																												b	b	b	b			b	b	b	b	b			b	b	b	b	
その他工事（一般保守作業）	全ブロック	夜間	電気設備保守作業(電路・信号)				●							●							●			●							●				●		●			●							
	Bブロック	夜間	線路保守作業									●		●										●																							
			電気設備保守作業(信号・通信)										●						●																													
			駅清掃作業																										●			●	●	●															
	BCブロック	夜間	資材運搬取卸作業																															●														

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業
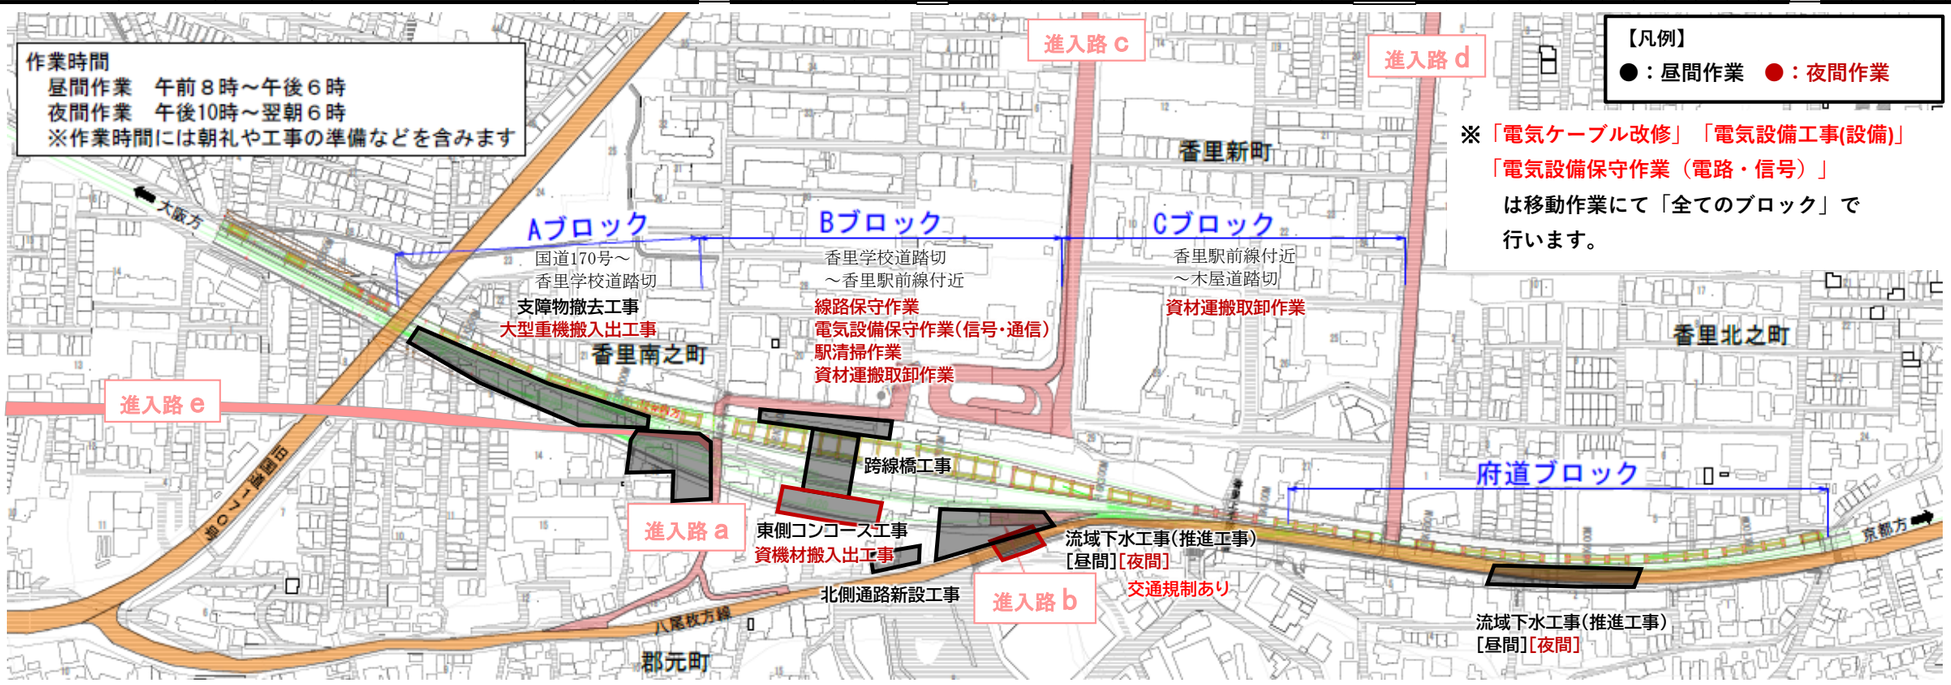
※「電気ケーブル改修」「電気設備工事(設備)」「電気設備保守作業（電路・信号）」は移動作業にて「全てのブロック」で行います。
