京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
前田建設・竹中土木・鉄建建設ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８４５－５６１０
夜間・休日 ０７２－８４５－５６１０

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第5工区　2026年7月分

				2026年6月							2026年7月																													2026年8月						
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	B ブロック	昼間	障害物撤去工事	○	○	○			○	○	●	●	●																																			
			[使用する進入路]								c,d	c,d	c,d																																			
		昼間	埋蔵文化財調査								●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			○	○	○	○	○
			[使用する進入路]								c ,d																																			
		夜間	電気設備工事(設備)													●		●																													
			[使用する進入路]													b,c		b,c																													
その他工事 (一般保守作業)	Aブロック	夜間	踏切保守作業（保線）											●					●																													
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(信号)																					●																							
			電気設備点検作業(電路)								●				●																					●		●				●						

※「電気設備点検作業(信号)(電路)」は、
移動作業にて「全ブロック」で行います。

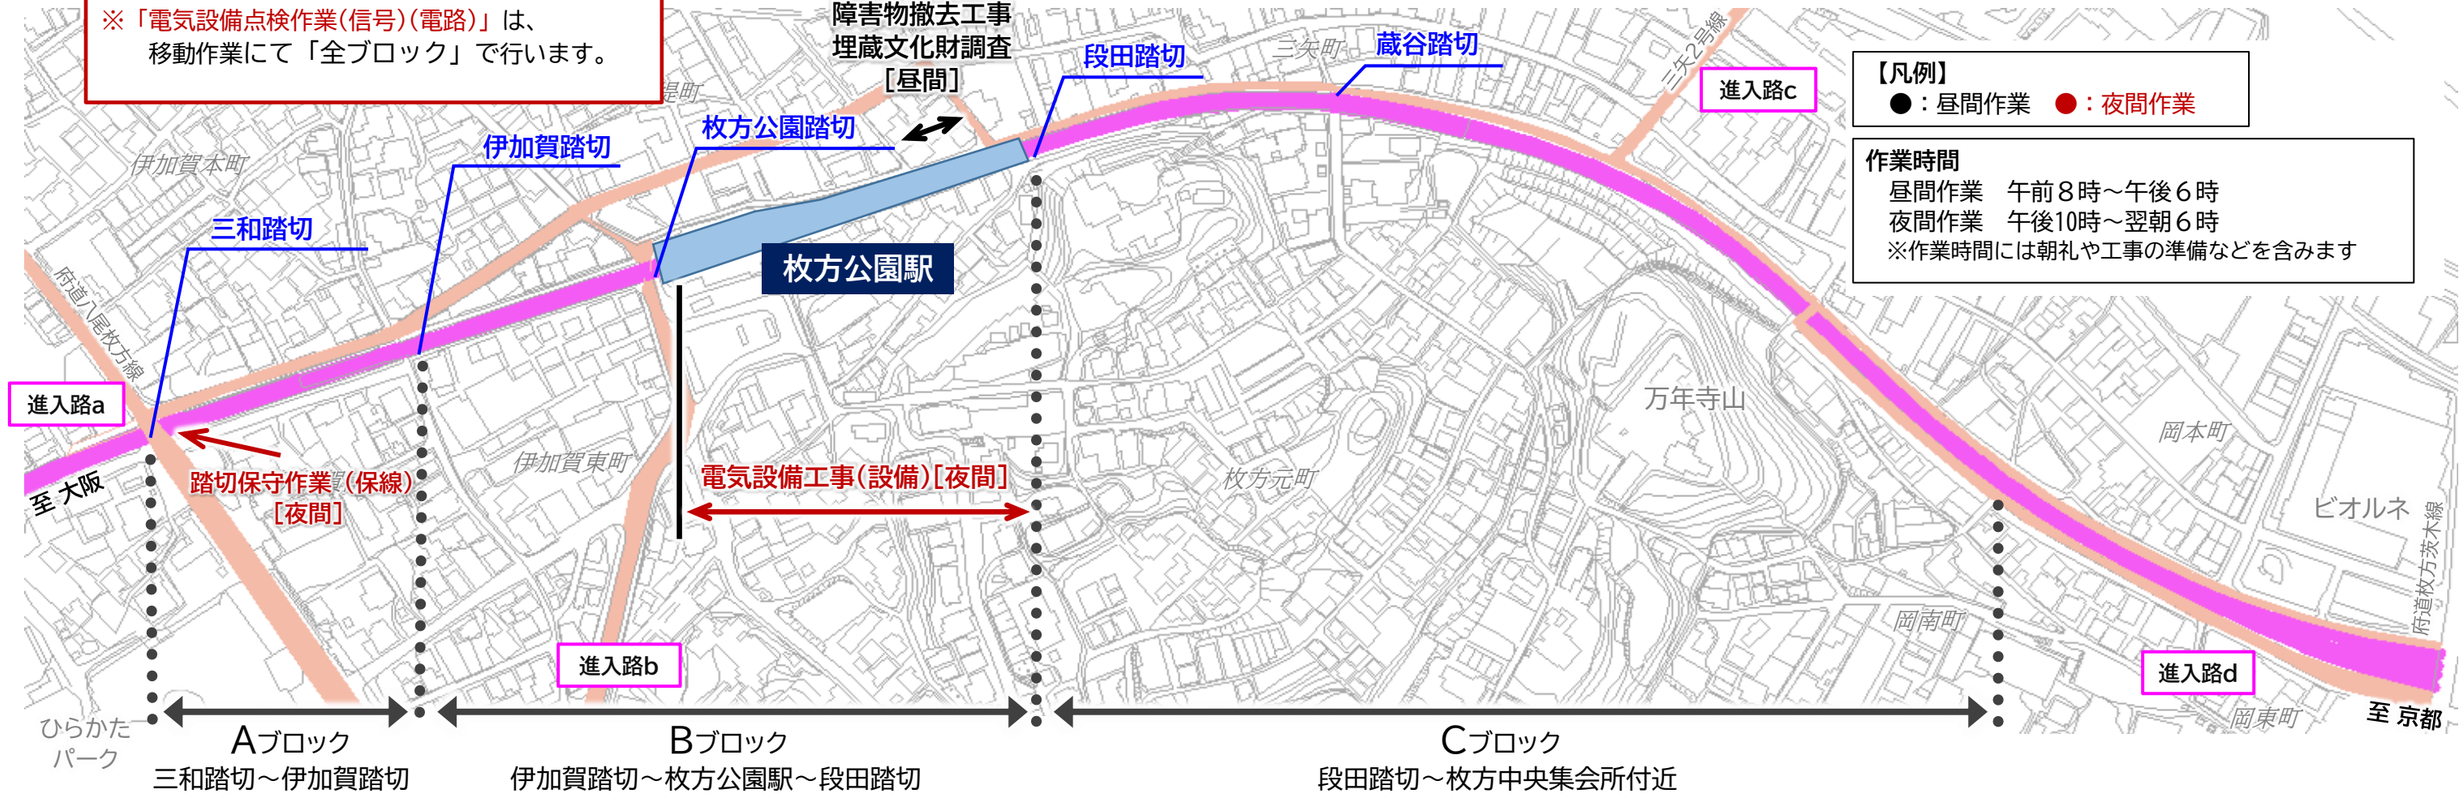

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます
